

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 9	
	Číslo SO/PS:	SO 01.1	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Demolice		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Demolice plochy před areálovým WC		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Změnový list řeší dodatečný požadavek Objednatel na úpravu ploch před WC na městské pláži, konkrétně demolici těchto ploch. Požadavek byl vznesen na 3 KD (viz. příloha Zápis z KD). Na základě tohoto požadavku vypracoval AD návrh řešení, který se týká provedení demolice stávajících ploch před WC (viz. příloha PD změny), konkrétně 55m obub a 59 m2 betonové dlažby. V Původní ZDS nebyla plocha před WC řešena, měl být ponechán původní povrch. Nové řešení : Tento změnový list řeší pouze demolice stávajících ploch před areálovým WC. Bude rozebrána plocha ze zámkové dlažby v ploše 59 m2 včetně vybourání stávajících obrub množství 55 m. Na zdemolovaných plochách před WC budou provedeny nové povrchy a to žulová dlažba 8/10 množství 47 m2 a nová dřevěná terasa o ploše 80,5 m2. Nové změny jsou znázorněny v PD změny. Tuto novou úpravu povrchu před WC na městské pláži řeší ZL 12 - změny ploch na MP. V místě vybouraného obrubníku v délce 35 m bude proveden nový intenzivní trávník v ploše 64 m2. Tuto úpravu řeší ZL8 - změny ploch trávníků na MP. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna demolice ploch před areálovým WC vznikla na základě požadavku Objednatel. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	32 826,17 Kč	
	Celkem bez DPH	32 826,17 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	6 893,50 Kč	
	Celkem včetně DPH	39 719,67 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	Ing. Jan Dědeček		
Autorský dozor:	Ing.arch. Zbyněk Ryška		
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	David Dinda		
	Mgr. Hana Nováková		
Zhotovitel:	Ing. Tomáš Holan		
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet ZL 9	6/2	
	Přehled nových položek	1/8	
	Přehled zařazení změn do skupin	1/9	
	Oznámení Variace č.9	1/10	
	PD - změny	2/11	
	Pokyn ZO	2/13	
	Vyjádření AD	1/15	
	Vyjádření TDS	2/16	
	Zápis z KD	7/18	
	Foto stávajících ploch	1/25	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z
ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:
Místo:

Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

18.01.2023

IČ:
DIČ:

00261891
CZ00261891

IČ:
DIČ:

26769611
CZ26769611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			32 826,17
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 32 826,17	Výše daně 6 893,50
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		39 719,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P/055/22		
Stavba:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže		
Místo:	Chomutov	Datum:	18.01.2023
Zadavatel:	Statutární město Chomutov	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero - Přemyslova	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			32 826,17	39 719,67
SO 01.1	Demolice / ZL 9		32 826,17	39 719,67
SO 01.1	Demolice - plocha před areálovým WC		32 826,17	39 719,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt:

SO 01.1 - Demolice / ZL 9

Soupis:

SO 01.1 - Demolice - plocha před areálovým WC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.01.2023

IČ:

00261891

DIČ:

CZ00261891

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 826,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 826,17	21,00%	6 893,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 719,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 01.1 - Demolice / ZL 9

Soupis: **SO 01.1 - Demolice - plocha před areálovým WC**

Místo: Datum: 18.01.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		32 826,17
HSV - Práce a dodávky HSV		32 826,17
1 - Zemní práce		32 826,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 01.1 - Demolice / ZL 9

Soupis: SO 01.1 - Demolice - plocha před areálovým WC

Místo: Datum: 18.01.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							32 826,17	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					32 826,17	

D	1	Zemní práce					32 826,17	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	59,000	90,70	5 351,30	SO 01.1
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	55,000	71,60	3 938,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		" BT 03 /demol. KOMUNIKACE: obrubník š. 20cm odvoz na skládku "					
	VV		20		20,000			
	VV		" demol. obruby písk.ploch / bet. obrubník š. 10cm (stojatý/foto) odvoz na skládku "					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		55,000			
3	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	17,110	199,00	3 404,89	SO 01.1
	VV		" BT 02 /dm.KOMUNIKACE: podklad. vrstva do hl. 0,29 m "					
	VV		59,0*0,29		17,110			
	VV		Součet		17,110			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	17,110	245,00	4 191,95	SO 01.1
	VV		" odvozy přebytků na recyklační skládku (kamení HDK ,ŠD z konstrukč.vrstev DM ploch)"					
	VV		"podkladní vrstva dlažby" 17,11		17,110			
	VV		Součet		17,110			
5	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	32,318	80,00	2 585,44	SO 01.1
	VV		" náklady na likvidaci odvozeného odpadu na skládku vč. poplatku za skládkovné nebo "					
	VV		" recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství "					
	VV		"podkladní vrstva tl. 0,29 m" 17,11*1,8		30,798			
	VV		"obrubníky" 0,8*1,9		1,520			
	VV		Součet		32,318			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,910	10,00	179,10	SO 01.1
	VV		"podkladní vrstva tl. 0,29 m" 17,11		17,110			
	VV		"obrubníky" 0,8		0,800			
	VV		Součet		17,910			
7	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,950	665,00	8 611,75	SO 01.1
	VV		" odvoz na úložnou skládku TKO (cca do 5km) "					
	VV		"betonové patky obrubníků" 2,4*2,2		5,280			
	VV		" hmoty na skládku investora (do 5km): zámková dlažba					
	VV		"zámková dlažba" 59*0,13		7,670			
	VV		Součet		12,950			
8	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	51,800	19,30	999,74	SO 01.1
	VV		" odvoz na úložnou skládku TKO (cca do 5km) "					
	VV		"betonové patky obrubníků" 2,4*2,2*4		21,120			
	VV		" hmoty na skládku investora (do 5km): zámková dlažba					
	VV		"zámková dlažba" 59*0,13*4		30,680			
	VV		Součet		51,800			
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,670	125,00	958,75	SO 01.1
	VV		"zámková dlažba" 59*0,13		7,670			
	VV		Součet		7,670			
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,455	120,00	1 494,60	SO 01.1
	VV		"betonové patky obrubníků" 2,4*2,2		5,280			
	VV		" obrubníky 35 m " 7,175		7,175			
	VV		Součet		12,455			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,200	138,00	165,60	SO 01.3
	VV		"BT 4 zásyp ŠD 16/32 po demolici obrubníku šířky 20 cm"					
	VV		1,2		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		1,200			
12	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	2,348	287,50	675,05	SO 01.3
		VV	"BT 4 zásyp ŠD 16/32 po demolici obrubníku šířky 20 cm"		2,348			
		VV	1,2*1,03*1,9		2,348			
		VV	Součet		2,348			
14	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	2,000	135,00	270,00	SO 01.1

Stavba : **Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže**

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK

P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	JC	Zdůvodnění JC
2	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	71,60	CS ÚRS 2022 02
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	138,00	SO 01.3
12	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	287,50	SO 01.3

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:										Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327										Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky				do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022	
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	64 786 160,01	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	115 419,08	bez ABS	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,17%	ABS	12=39	Sledování čerpání limitu	9 717 924 Kč	9 717 924 Kč	5 913 961 Kč	ABS											
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	66 210 247,83	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,18%		10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,01%	ABS	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	9 717 924 Kč	9 717 924 Kč	3 803 963 Kč	ABS											
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	102,20%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 435 848,00 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	32 393 080,01 Kč		14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky				9,13%	ABS										
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%																									
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%																									
15 % z Přijaté smluvní částky		9 717 924,00 Kč																									

OK v limitu

S(27/1)*100		Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%		Skupiny změn																							
15 % z Přijaté smluvní částky					9 717 924,00 Kč																							
					-1-			-2-			-3-				-4-				-5-					-6-				
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					Smluvní kompenzační nároky				
SO	ZL č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné				
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37	40				
			- 2 302 645,90	3 726 733,72	1 424 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 724,28	109 724,28	109 724,28	0,00	5 694,80	5 694,80	5 694,80	- 2 302 645,90	3 611 314,64	9,13%	5 913 960,54	0,00				
SO 05	1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP	0,00	76 788,61	76 788,61			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76 788,61	0,12%	76 788,61					
SO 12	2	PLYNOVOD / Přelozka HUP do země	0,00	109 724,28	109 724,28			0,00			0,00	0,00	109 724,28	109 724,28	109 724,28			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00					
SO 01	3	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / změna sanace zemní pláně	- 1 619 564,50	1 378 466,01	- 241 098,49			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 1 619 564,50	1 378 466,01	2,13%	2 998 030,51					
SO 01	4	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / vypouštění dešťové kanalizace v parkovišti	0,00	51 737,06	51 737,06			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51 737,06	0,08%	51 737,06					
SO 09	5	ZAULAHY NAPOJENÍ / Nový závlahový systém	0,00	1 194 840,21	1 194 840,21			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 194 840,21	1,84%	1 194 840,21					
SO 04.10	6	Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti / Kácení smrků U Řevy	0,00	5 694,80	5 694,80			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	5 694,80	5 694,80	5 694,80		0,00	0,00%	0,00					
SO 01	7	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / úprava výjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst	- 436 458,15	430 959,94	- 5 498,21			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-436 458,15	430 959,94	1,34%	867 418,09					
SO 04	8	ZELENÍ / Změna ploch trávníků na městsképláži	- 246 623,25	445 696,64	199 073,39			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-246 623,25	445 696,64	1,07%	692 319,89					
SO 01.1	9	Demolice / Demolice plochy pře arealovým WC		32 826,17	32 826,17			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	32 826,17	0,05%	32 826,17					
				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					
				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00					

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Statutární město Chomutov
Ing. Jan Dědeček
Zástupce Objednatele

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 24.11.2022

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Oznámení Variace č.9 – Městská pláž – demolice plochy před WC

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. d202200327 na akci Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, dle Smluvních podmínek, čl. 12.1, oznamuje Zhotovitel Variaci č.9, která se týká víceprací za demolice před WC v prostoru městské pláže dle požadavku Objednatele.

Před WC bude rozebrána plocha ze zámkové dlažby včetně vybourání stávajících obrub.

AD vypracoval návrh řešení včetně výkazu výměr, který zhotovitel ocenil.

Zhotovitel předkládá rozpočet Variace č.9 ve výši **32 826,17 Kč bez DPH**.

SILNICE TOPOLANY a.s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734




⑨


Jiří Blochin
Příprava stavby

Přílohy: Rozpočet Variace č.9

* BOUNDÁŘÍ OŘEUBÍ 5514

* ROZEBRANÁ 'DLAŽBA 5062

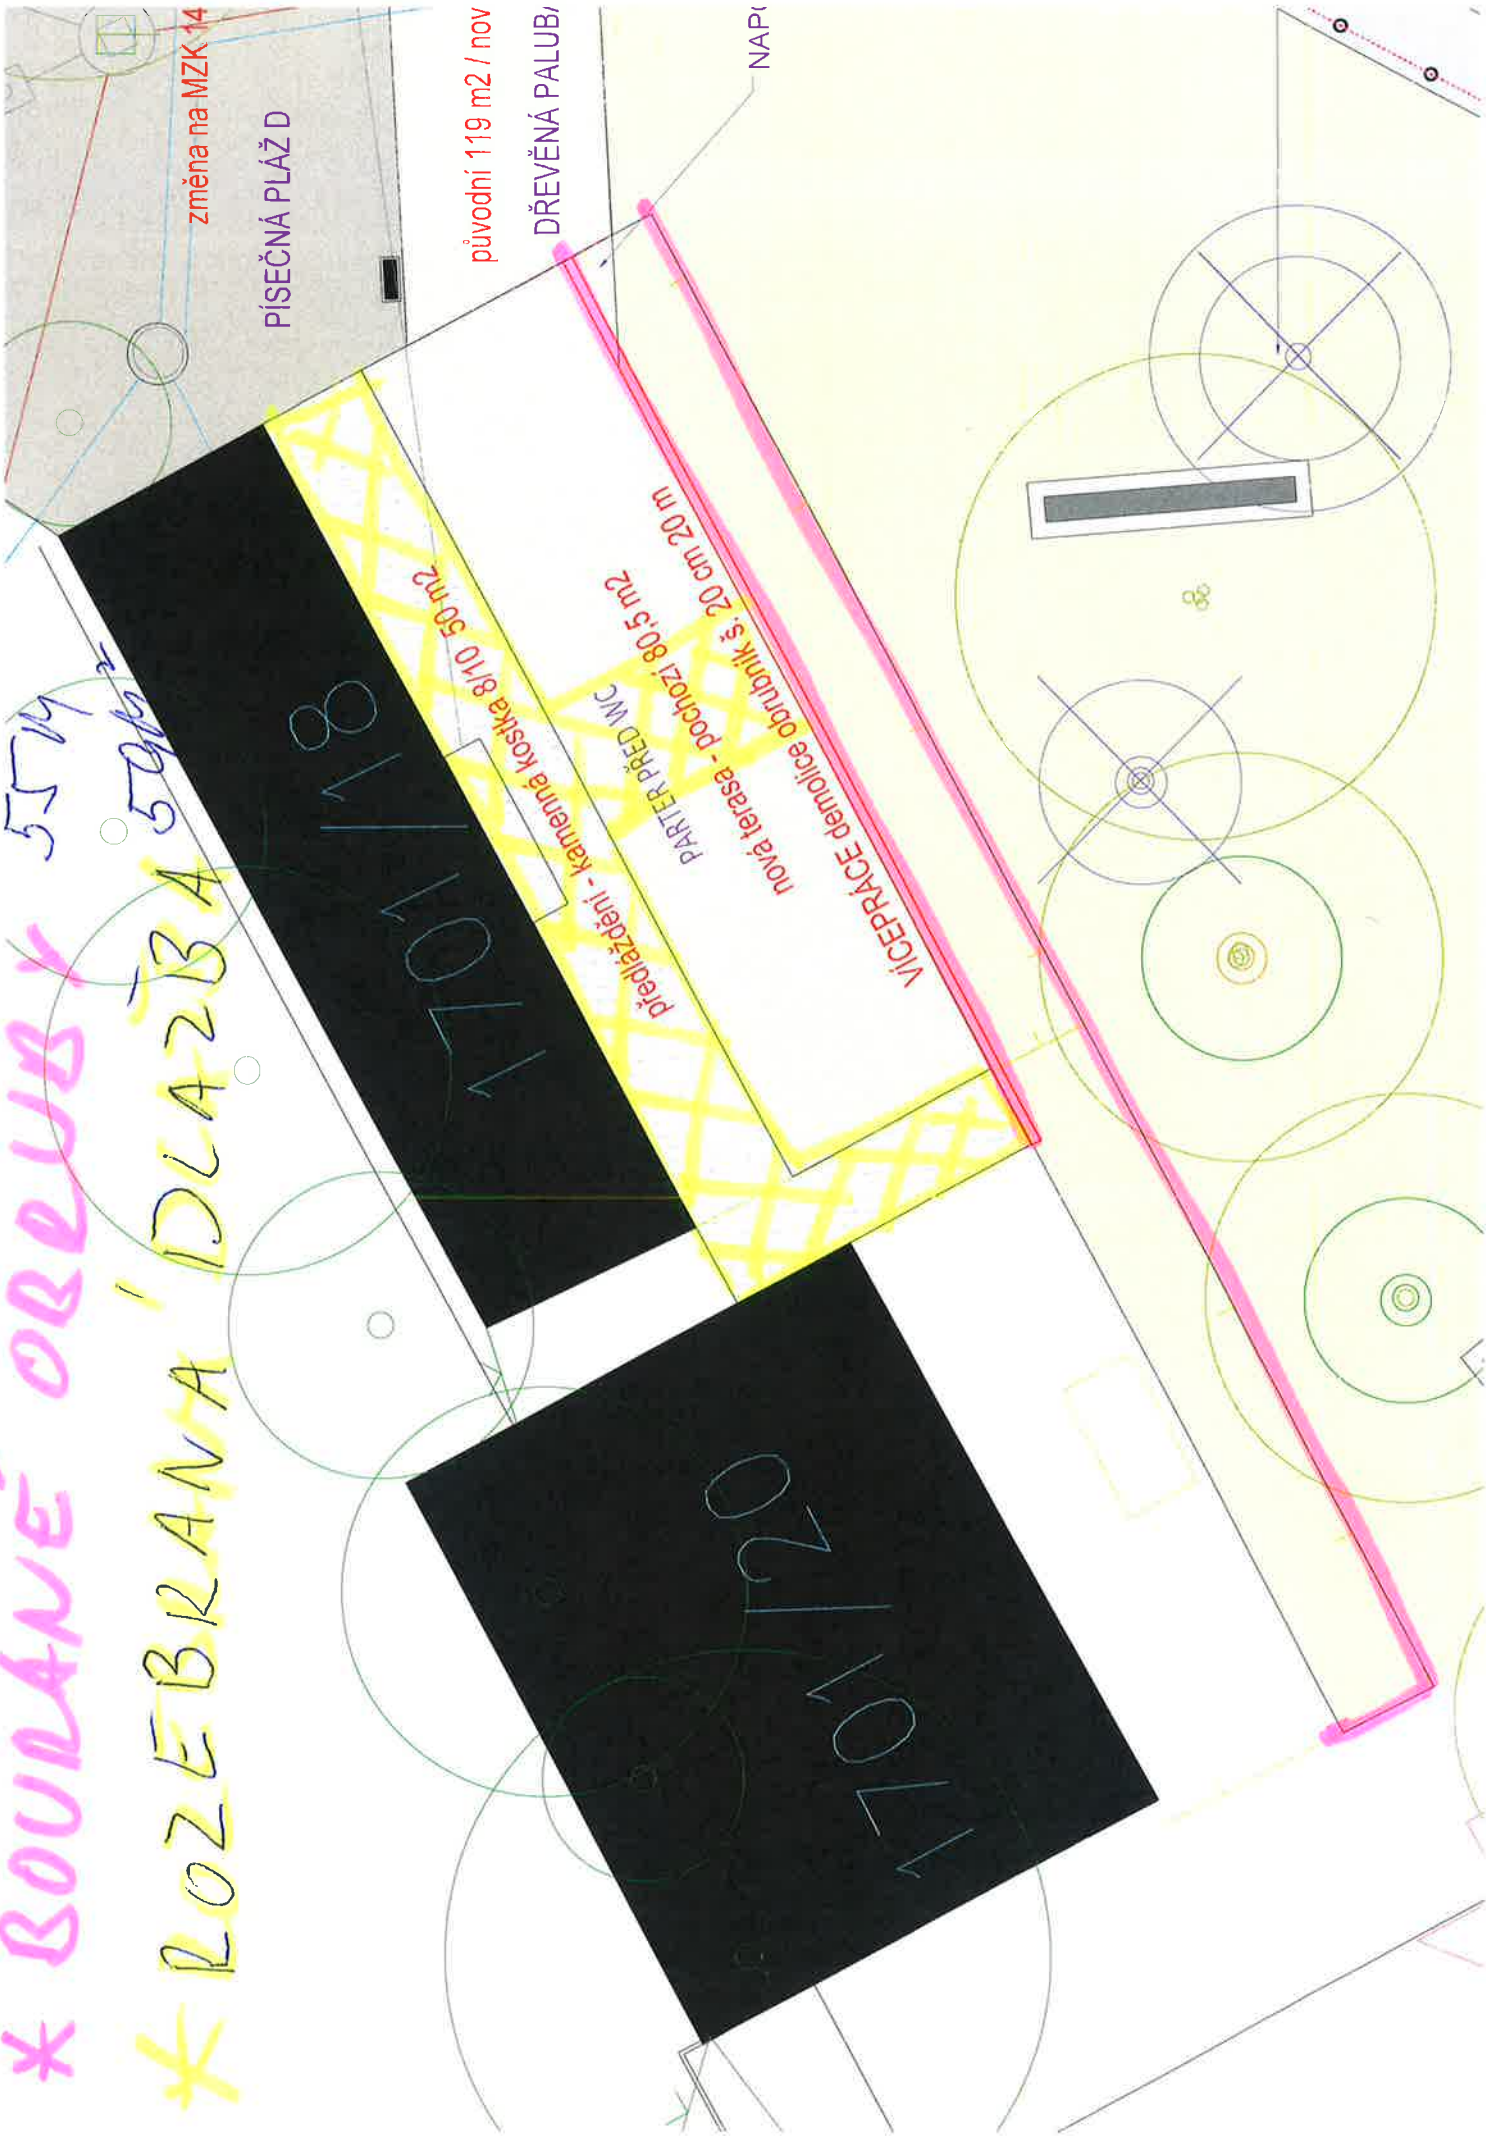

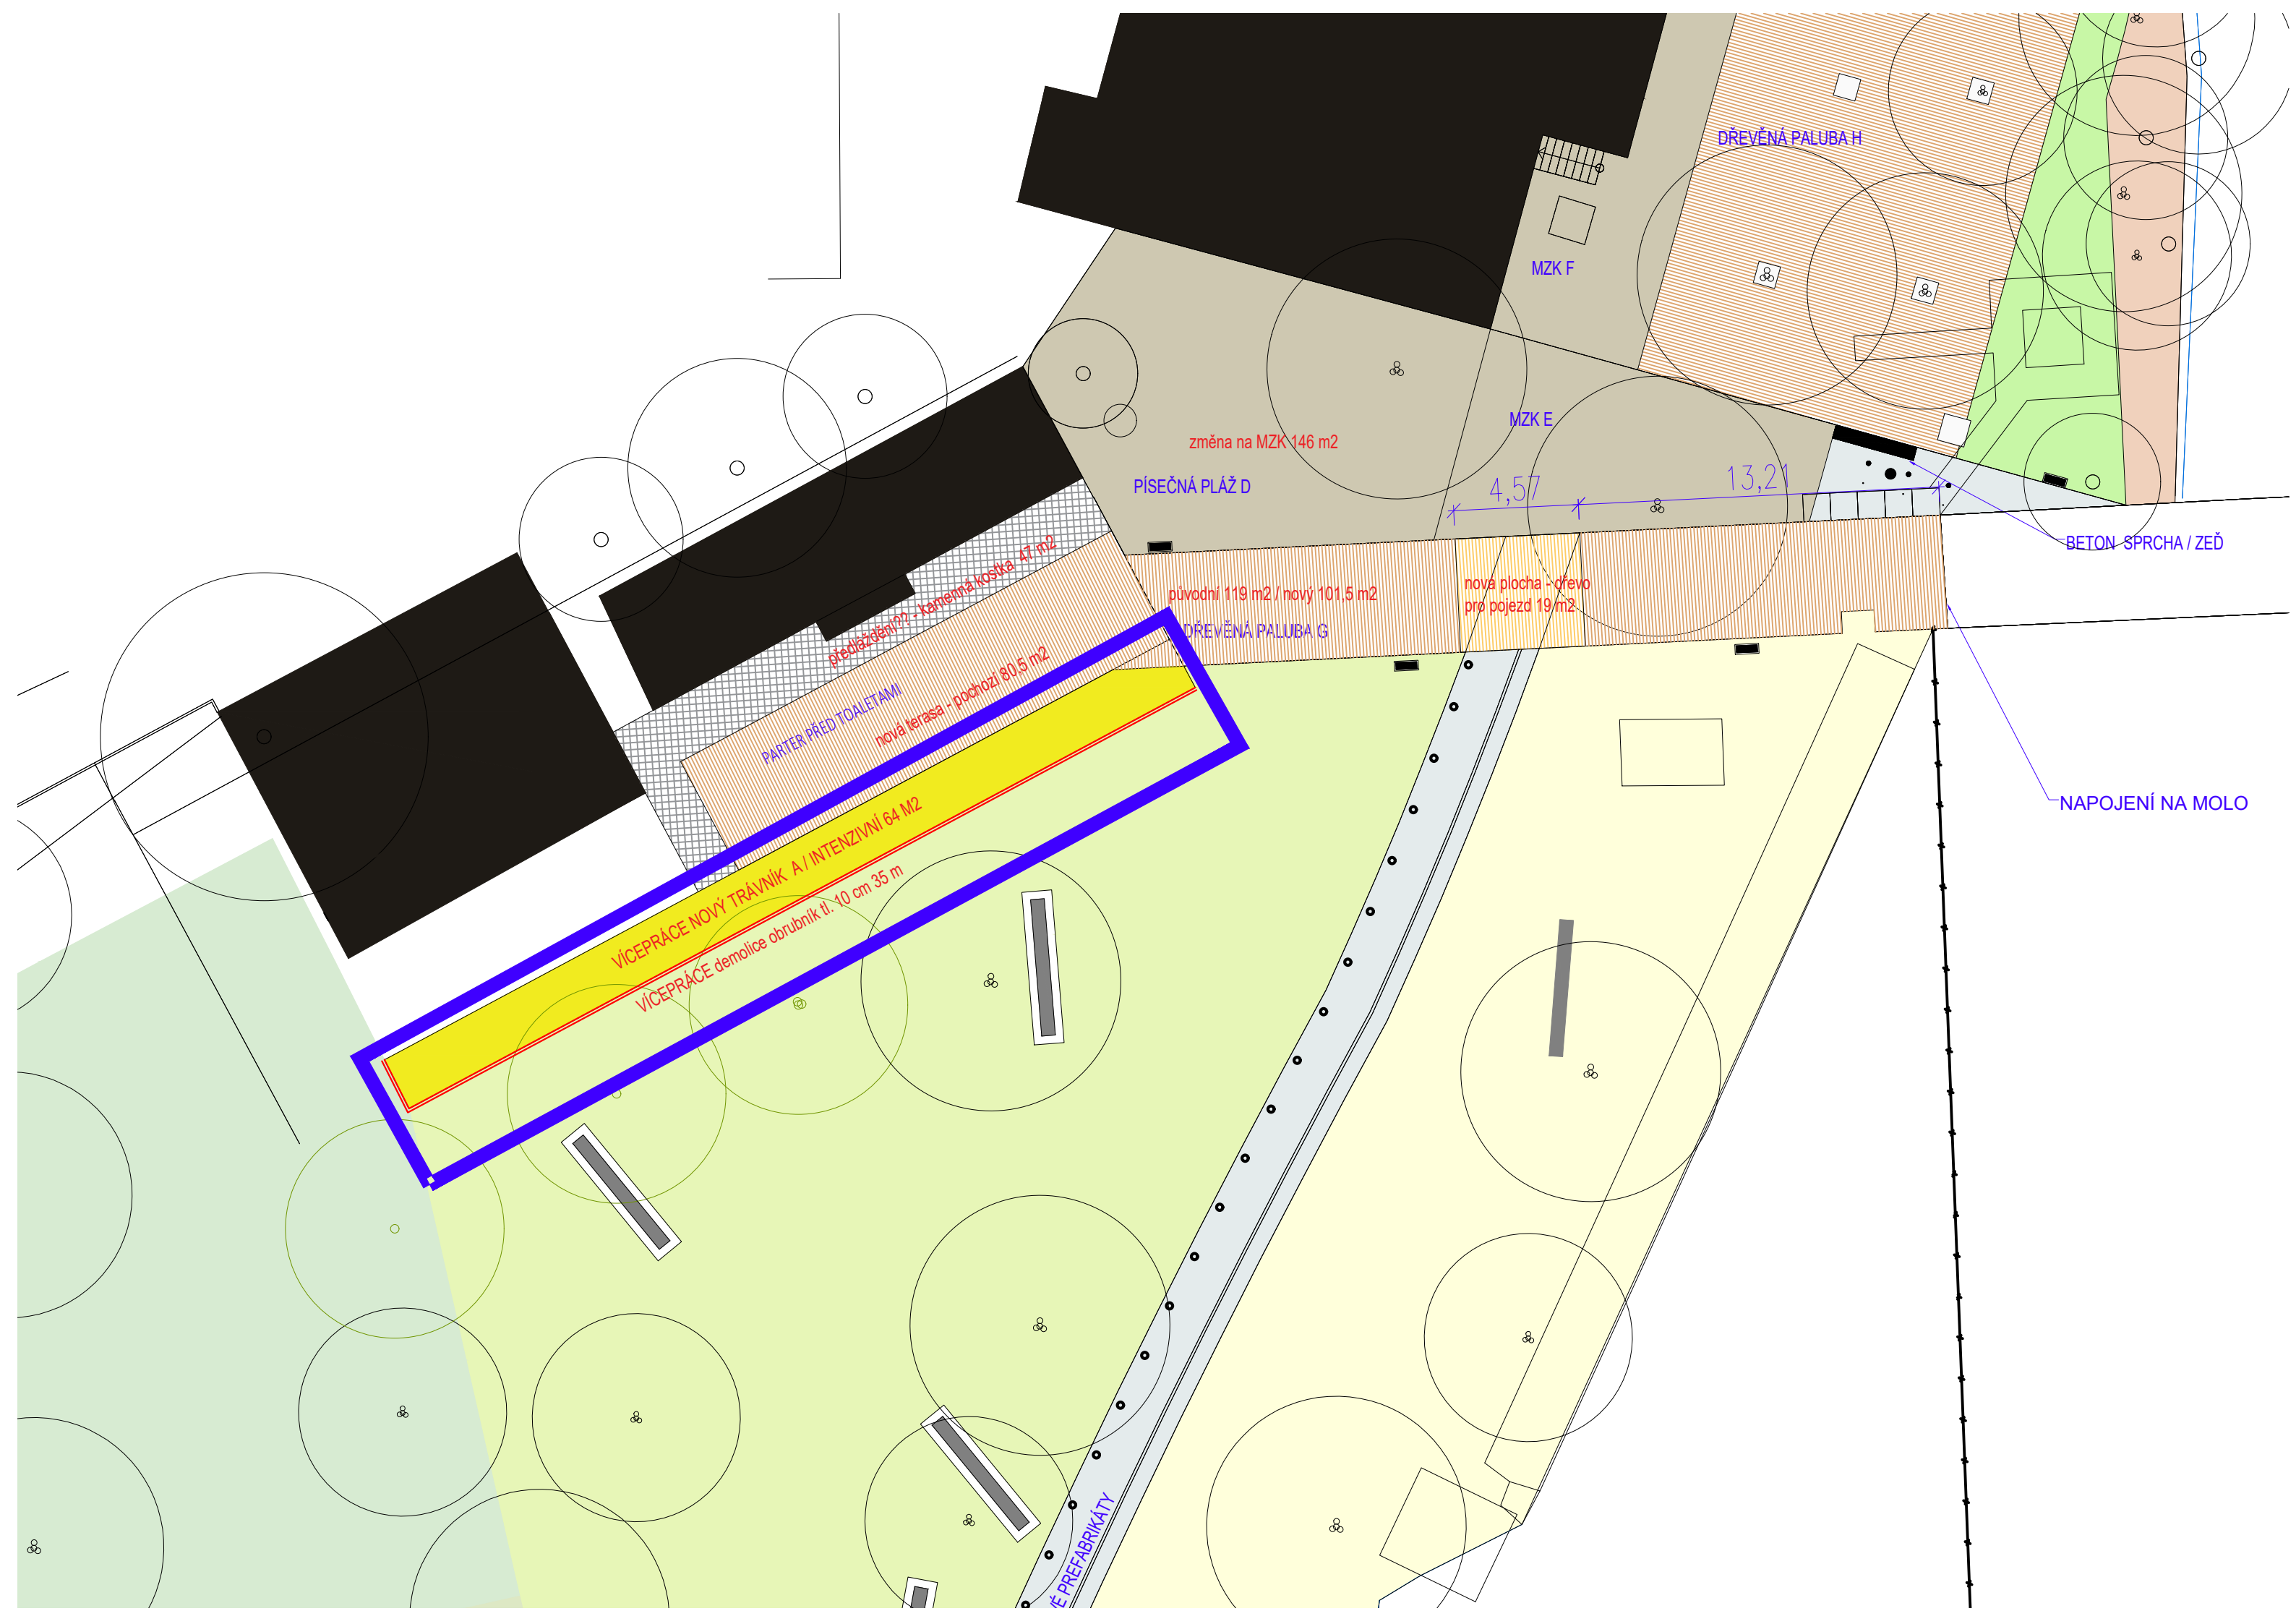

Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/020
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele
Datum: 09.01.2023

**Společnost Kamencové jezero
- Přemyslova**

Jiří Blochin
Silnice Topolany a.s.
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10

Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 9

Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Smlouva: Číslo smlouvy d202200327
Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP)

Související korespondence „Oznámení Variace č. 9 - Městská pláž – demolice plochy před WC“ ze dne 24.11.2022

Vážený pane Blochine,

Vaším dopisem ze dne 24.11.2022 jste předložili návrh Variace č. 9, která spočívá v rozebrání plochy ze zámkové dlažby a vybourání stávajících obrub před prostorem WC (dále jen „**Variace č. 9**“). Návrh Variace č. 9 jste předložili na základě předchozího požadavku Objednatele.

Provedení Variace č. 9 podle Vámi předloženého ocenění vyvolá změny kladné ve výši 32 826,17 Kč bez DPH. Neuvedli jste případný dopad Variace č. 9 na Dobu pro dokončení a smluvní Milník č. 1.

Autorský dozor se k návrhu Variace č. 9 vyjádřil svým vyjádřením ze dne 05.12.2022, ve kterém souhlasil s provedením Variace č. 9.

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) (dále jen „**TDS**“) se k Variaci č. 9 vyjádřil svým e-mailem ze dne 03.01.2022, ve kterém s ní souhlasil.

Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení Variace č. 9 podle Vašeho návrhu.

Definitivní ocenění Variace č. 9 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 9, a to bezodkladně, nejpozději však do 21 dní ode dne doručení tohoto dopisu.



S ohledem na to, že jste ve svém návrhu Variace č. 9 neuvedli její časový dopad, mám za to, že provedení Variace č. 9 nezpůsobilo a nezpůsobí žádné zpoždění.

S pozdravem

Jan
Dědeček

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.01.09 15:10:21 +01'00'

Ing. Jan Dědeček
Zástupce Objednatele

Přílohy:

- „Vyjádření AD – Oznámení Variace č. 9 Městská pláž – demolice plochy před WC“ ze dne 05.12.2022
- „Vyjádření TDS“ e-mail ze dne 03.01.2023



Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Oznámení Variace č. 9 Městská pláž – demolice plochy před WC

Za AD souhlasíme s demolicí plochy ze zámkové dlažby, včetně vybourání stávajících obrub.

V Brně dne 5. 12. 2022

Ing. arch. Zbyněk Ryška
jednatel Refuel s.r.o.

zbynek@refuel.cz
+420 736 605 107

Ing. Arch.
Zbyněk
Ryška

Digitálně podepsal Ing.
Arch. Zbyněk Ryška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-2484930
8, o=Refuel s.r.o., ou=1,
cn=Ing. Arch. Zbyněk
Ryška, sn=Ryška,
givenName=Zbyněk,
serialNumber=P676123
Datum: 2022.12.05
09:09:21 +01'00'

Od: j.justra <j.justra@garnets.cz>
Odesláno: úterý 3. ledna 2023 20:53
Komu: David Klíma; Zbynek Ryska; jan
Kopie: Jan Dědeček
Předmět: RE: KJ - Přemyslova - Oznámení Variace č.9 - demolice plochy před WC na městské pláži

Dobrý den, za TDS souhlasím s předloženou Variace č.9 - demolice plochy před WC na městské pláži. Kontrolu jednotkových cen zajišťuje pověřený člen týmu Správce stavby, není součástí vyjádření TDS.

S pozdravem

Bc. Jakub Justra

manažer projektu

GARNETS CONSULTING a.s.

kancelář/sídlo: Čs. legií 445/4, Teplice, 415 01

mobil: +420 602 292 602

fax: +420 417 532 951

e-mail: j.justra@garnets.cz

web: www.garnets.cz

From: David Klíma <klima@cmanagement.cz>
Sent: Wednesday, November 30, 2022 12:02 PM
To: Zbynek Ryska <zbynek@refuel.cz>; jan <jan@refuel.cz>; j.justra <j.justra@garnets.cz>
Cc: Jan Dědeček <dedecek@cmanagement.cz>
Subject: FW: KJ - Přemyslova - Oznámení Variace č.9 - demolice plochy před WC na městské pláži

Dobrý den,

přílohou si Vám dovoluji zaslat návrh Variace č. 9 a žádám Vás, abyste mi k němu zaslali Vaše vyjádření. Ve Vašem vyjádření uveďte zejména, jestli s provedením a oceněním Variace č. 9 podle návrhu Zhotovitele souhlasíte.

Vaše vyjádření mi, prosím, zašlete do dne 06.12.2022.

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem a poděkováním za spolupráci



DAVID KLÍMA

konzultant-právník



+420 736 242 868

klima@cmanagement.cz

www.contractmanagement.cz

Parkview, Pujmanové 1753/10a

140 00 Praha 4

From: Jiří Blochin <blochin@silnicetopolany.cz>

Sent: Thursday, November 24, 2022 4:13 PM

To: Jan Dědeček <dedecek@cmanagement.cz>

Cc: j.kuna <j.kuna@chomutov-mesto.cz>; j.justra <j.justra@garnets.cz>

Subject: KJ - Přemyslova - Oznámení Variace č.9 - demolice plochy před WC na městské pláži

Dobrý den, v příloze posílám Oznámení Variace č.9, která se týká demolice plochy před WC na městské pláži.

S pozdravem

Jiří Blochin

Příprava stavby

Mobil: +420 602 233 080

Email: blochin@silnicetopolany.cz



Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov | CZ

IČ:05758734 | DIČ CZ05758734, Ivedeno Krajským soudem v Ústí n Labem, oddíl B, vložka 2772

Provozovna/korespondenční adresa: Tušimice 34 | 432 01 Kadaň

ID DS: nkqbe33 | web: www.silnicetopolany.cz

Zápis z kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“

Kontrolní den č. 3

Datum: 04.10.2022
Čas: 10:30 hodin
Místo: Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká
Zapsal: Ing. Jan Dědeček
Přítomni: dle prezenční listiny

Program KD:

- A. Informace o průběhu prací
 - B. Kontrolní body a jejich plnění
 - C. BOZP
 - D. Závěr a poznámky
-

A. Informace o průběhu prací

01KD – Předání staveniště proběhlo dne 19.09.2022. Z předání Staveniště je vyhotoven samostatný zápis.

SO 04 Sadové úpravy - Na parkovišti bylo zahájeno kácení stromů (dále viz bod B1.7)

02KD

SO 01 – Na parkovišti se zajišťuje DIO – předpoklad získání povolení od MmCh konec tohoto týdne – venku mimo areál práce zatím neprobíhají.

SO 04 – v areálu probíhá kácení, venku již proběhlo, alej se bude kácet až po získání DIO, probíhá skrávkování drnu, probíhá zdravotní řez stromů.

Nový objekt, probíhá odstranění závlahy, viz bod B1.8.

SO 01 (pláž) – probíhá kácení, bourací a demoliční práce.

03KD

SO 05a – proběhlo bourání podlah, bourání plotu typu 1, 2 a 3 (na parkovišti)

SO 01 (pláž) – probíhají demolice a bourací práce

SO 01 komunikace – odstraňování asfaltu

SO 04 – co bylo možné je pokáceno, proběhlo sejmutí drnu

Proběhlo vytyčení komunikace na pláži – trasa A, více viz bod B3.6

SO 04 (pláž) – vykopány jámy pro nové stromy

B. Kontrolní body a jejich plnění

B1.1 – Zařízení staveniště

01KD – Zhotovitel si zajistí oplocení. DIO je odsouhlasené od PČR čeká se na souhlas z MmCh.

02KD – DIO TRVÁ, oplocení vnitřního areálu zajištěno, dovezena 1x TOI TOI

03KD – DIO TRVÁ

B1.2 – Prostory pro KD

01KD – pro pořádání KD jsou zajištěny prostory v rámci restaurace Golf Club.



B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele**01KD**

- Zhotovitel předloží Počáteční harmonogram se začátkem realizace k 19.09.2022 **co nejdříve jak to bude možné**, nejpozději do 30.09.2022. – **02KD TRVÁ**
- Zhotovitel předal organigram týmu Zhotovitele. ZO požaduje jeho aktualizaci při jakýchkoliv změnách.

03KD

- Počáteční HMG byl předložen 03.10.2022 – ZO upozorňuje, že HMG byl předložen po termínu dle SoD!
- ZO se k HMG vyjádří ve smluvním termínu.

B1.4 – Zpráva o postupu prací**01KD**

- První měsíční zpráva bude vypracována za období 09/2022. Zhotovitel ji předloží nejpozději do 07.10.2022 v souladu s Pod-čl. 4.4 OP/ZP.

B1.5 – Včasná varování, claimy, ZBV**01KD**

- Zhotovitel avizoval předložení claimu č. 1 – posun milníku č. 1 kvůli posunu zahájení stavby s vlivem na založení štěrkových trávníků – **02KD, 03KD TRVÁ**
- Zhotovitel zašle oznámení ohledně Variace na závlahu (viz bod B1.8) – **02KD, 03KD TRVÁ**

B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán

01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 dní před zahájením prací.

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy včetně KZP,
- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby.
 - o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány
 - o Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy
 - o Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby
 - o Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky
 - o Vádící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vodící linie
- Vzorky jsou odsouhlaseny.

B1.7 – Zeleně**Kácení****01KD**

- Objednatel požaduje, aby se stromy v rámci aleje kácely až od 27.09.2022.
- V rámci projektové dokumentace byl zjištěn nesoulad oproti povolení o kácení. Dub letní číslo 12 se kácen nebude – bylo požádáno o kácení, nebyl však povolen.
- Zhotovitel si zajistí zábor stromu č. 12 – viz stavební deník.

02KD

- Z důvodu zdravotního stavu nepovolené vrby v areálu nechá AD dopovolit ke kácení. Vrba je napadená a do pár let by bylo nutné ji pokácet. Objednatel souhlasí.

03KD

- Znalec se vyjádří ke 2 stromům, které nejsou určeny ke kácení – vrba a jasan v areálu, jakým způsobem s nimi bude naloženo – vrba je napadena, u jasanu hrozí jeho rozlomení.
 - Dub na parkovišti je nutno více oplotit. Je třeba při zemních pracích dát maximální pozor na kořenový systém, přerušené kořeny je nutno ošetřit a dle redukce
-



kořenového systému je nutné adekvátně prořezat i korunu stromů. Zhotovitel bude komunikovat s OŽP při každém zjištěném problému.

- **Objednatel požaduje neprovádět žádné zásahy do uvedených stromů bez předchozího odsouhlasení Objednatele.**

Štěrkové trávniky

01KD

- AD na KD předal Objednateli prezentaci ohledně štěrkových trávníků.
- Zhotovitel uvažoval použití černého čediče. AD navrhuje jinou barevnou variantu (šedá či jinak barevná). AD se pokusí sehnat vhodné kamenivo v dojezdové vzdálenosti do 30 km, kterou Zhotovitel uvažoval. **02KD – vyřešeno – nedohledána jiná varianta, Zhotovitel použije co bude k dispozici.**
- Na štěrkové trávniky je navázán časový milník pro provedení parkoviště – Zhotovitel je schopen založit trávník v zimním období a dosít na jaře. Trávniky musí být založeny do konce stavby a musí být v klidu v rámci vegetačního období (odpovídá 03-05/2023). Až do 06/2022 je třeba mít zajištěné DIO – zajistí si Zhotovitel.
- ZO upozorňuje, že časový milník je možné posunout pouze v souladu se smlouvou. Zhotovitel předloží oznámení claimu, vzhledem k posunu zahájení Stavby.
- **Parkovací místa jsou v projektu oddělena kamennými kostkami, což není vhodné řešení – nebezpečí vyvalení. AD zjistí jaké řešení je uvažováno – do příštího KD 27.09.2022 – 02KD 03KD TRVÁ**

03KD

- Požadavek AD - štěrkový trávník v části pláž bude míchán s frakcí 4/8, 60 % štěrku (v PD je frakce 8/16). Kvůli případným problémům s údržbou. Objednatel souhlasí. Zhotovitel zašle návrh Variace.
- **Oddělení parkovacích míst – TRVÁ**

B1.8 – Dílenská dokumentace - Závlaha

01KD

- Závlaha je v cizím majetku (ne města).
- **Objednatel požaduje navrhnout novou závlahu nad rámec ZDS – Zhotovitel nechá zpracovat PD v součinnosti s AD a Objednatel a nové řešení ocení – PD bude zaslána k odsouhlasení na AD, TDS a Objednatele. Následně Zhotovitel zašle Návrh Variace.**
- Retenční nádrž bude zadána do výroby dle návrhu Dodavatele – AD odsouhlasí – čerpací šachta se vypouští.
- V rámci vedení pro závlahu se protáhne trubka pro přípravu NN a datových rozvodů.

02KD

- **TRVÁ, návaznost na bod B1.11**

03KD - TRVÁ

B1.9 – SO 05 vstupní objekt – založení

01KD

- AD prověří, jak je ve výkazu výměr řešeno bednění středních pasů (zda nechybí položky). AD případně doplní.

02KD

- Byla posouzena základová spára objektu, bude doplněn podkladový beton dle návrhu statika. Zajistí AD.
- Bednění ve výkazu nebylo, bude doplněno a řešeno změnovým listem. AD doplní PD a výkaz výměr.

03KD

- **AD doplnil změnový rozpočet s doplněním bednění středních pasů. ZO zašle Zhotoviteli k ocenění. Zhotovitel předloží návrh Variace dle Pod-čl. 12.1 OP/ZP.**
 - **Založení bude řešeno betonovou deskou pod pasy – beton bude řešen dle rozboru nalezené spodní vody, viz bod B1.11.**
-



B1.10 – Společné uložení

01KD

- ZO zajistí společné uložení (MS Teams/Sharepoint) – bude nahrána ZDS včetně všech povolení a budou vkládána veškeré revize PD – číslované. – **02KD** splněno

02KD

- AD bude vkládat změnovou dokumentaci a upozorňovat ZO. ZO následně rozešle dále.

03KD

- Změnová dokumentace s výkazy výměr zpracovaná AD a vložená na uložení bude ze strany ZO přímo zasílána na Zhotovitele pro účely ocenění a zpracování návrhů Variace. Objednatel s postupem souhlasí.

B1.11 – Retenční nádrž

01KD

- Pro posouzení základové spáry retenční nádrže v rámci SO 03 bude na další KD přizván statik a geolog.

02KD

- Objednatel požaduje přípravu retenční nádrže na připojení případné závlahy.
- Přepad z retenční nádrže nelze svádět do Kamencového jezera, jak bylo původně navrženo v projektu (původní požadavek Objednatele). Bude řešeno vsakem.
- Zhotovitel ověří použitelnost vody nalezené v provedené sondě pro dopouštění retence – budou provedeny rozboru vody.
- Projektant si prověří kapacity, a zašle nabídku na Objednatele ohledně zpracování požadovaného řešení.
- Dále proběhlo posouzení základové spáry, stavba provede rozbor vody, bude provedena podkladní betonová deska a Zhotovitel si objedná vhodnou retenční nádrž do prostředí dle rozboru nalezené vody.
- Projektovou dokumentaci zajistí AD.

03KD

- Zhotovitel nechal provést rozboru vody – výsledky byly zaslány výrobci retenční nádrže k návrhu a k dnešnímu dni předáno na AD pro určení vhodného řešení založení retenční nádrže. V PD je navržena základová deska, pokud bude nutné změnit materiál bude řešeno jako Variace.
- Napojení pitné vody na retenci je v řešení u AD.

B2.1 – Veřejné osvětlení

02KD

- Je třeba vyřešit propojení VO v aleji mezi areálem a parkovištěm pro zachování osvětlení okolních ulic, které nejsou součástí staveniště. Projekt s tím nepočítá, Zhotovitel předloží návrh Variace s oceněným výkazem výměr.

03KD – u VO není potřeba provizorní rozvod, bude řešeno v rámci prosmýškování okolních ulic - vyřešeno

B2.2 – Příjezdové cesty

02KD

- ~~Byl vznesen požadavek provozního areálu na zbudování příjezdové cesty – Bude řešeno dle projektu, zásobování restaurace bude řešeno jiným způsobem mimo projekt a mimo Stavbu. – 03KD vypouští se~~

B2.3 – Elektro

02KD

- Je třeba se domluvit s ČEZem ohledně přeložení pilíře u vjezdu do areálu – je třeba zajistit vyjádření ČEZu. Zajistí Zhotovitel.
 - Zhotovitel prověří u ČEZu, zda musí být pilíř bílý a plastový jak je nyní. AD by preferoval jinou variantu pokud bude možné.
-



03KD – pilíř u vjezdu bude zrušen – Objednatel si podá žádost o zrušení, ČEZ dle informací je schopen provést do cca 1 týdne. Nové napojení bude provedeno ze stávající skříně v areálu. AD připraví projekt. – **Stávající skříň brání založení SO 05, přeložení by dle ČEZ trvalo cca 1 rok.**

B2.4 – Pláž u restaurace Dřevák

02KD

- Zhotovitel navrhnul změnu povrchu na MZK vzhledem k nalezeným 3 šachtám v místě navržené pláže.
- **Bude provedeno dle projektu** – bude písčiná pláž.
- AD prověří případný požadavek na sjednocení ostatních povrchů v bezprostředním okolí restaurace Dřevák.

03KD – Objednatel požaduje změnu písku na pláži u Dřeváku (písčiná pláž D) za mlat z důvodu sjednocení povrchů v okolí restaurace. Zhotovitel zašle návrh Variace.

B2.5 – Přejezd pro vozítka u vstupu do areálu

- Byl vznesen požadavek provozovatele areálu na zbudování přejezdu pro vozítka (vývoz odpadu, dílčí zásobování apod.) u vstupního objektu – spojení mezi 2 cestami v areálu. AD prověří možné řešení.

03KD – TRVÁ – Objednatel upřesnil požadavek na zbudování propojení mezi asfaltovou cestou za SO 05 a Trasou A – AD prověří a navrhne řešení.

B3.1 Splašková kanalizace

- Je nutno vyřešit napojení SO 05, který měl být napojen do stávající šachty, která na pozemku nebyla nalezena. Je třeba šachtu nově vybudovat a provést přípojku na hlavní stoku v Přemyslově ulici. AD prověří místo napojení nově navržené splaškové tlakové kanalizace.
- AD prověří možnost napojení nové splaškové kanalizace ze stávajících objektů na pláži formou tlakové kanalizace (čerpací stanice). Předpoklad příští KD.

B3.2 Zázemí u záchodů a grilbaru

- Objednatel požaduje doplnění řešení zázemí před záchody a grilbarem – jedná se o rozšíření demolice obrubníků a rozšíření travnaté plochy.
- Před WC bude ze strany AD předložen návrh řešení parteru.
- AD prověří jak je řešeno území před záchody v územní studii.

B3.3 Paluba molo

- AD vyřeší požadavek Objednatele na zajištění přejezdu obslužního vozíku přes palubu.

B3.4 Upřesnění navržených řešení ze ZDS

- Zhotovitel žádá o upřesnění výrobce sprch – AD prověří.
- AD upřesní navržené řešení vypouštění sprch a uložení zemních svítidel v betonových prefabrikátech – AD upřesní detail řešení.

B3.5 VO v areálu

- Objednatel požaduje výměnu stávající napojovací lampy. Zhotovitel předloží návrh Variace.

B3.6 – Trasa A

- SO 02 – trasa bude zúžena před dřevěný rošt před stávajícími kójemi. Rošt bude vyrovnán. Detail řešení od AD viz příloha zápisu. Objednatel s návrhem souhlasí. AD zajistí změnový výkaz výměr, Zhotovitel zašle návrh Variace.

B3.7 – Turnikety

- Je třeba vyřešit řešení turniketu – v projektu není vyřešen samostatný odchod návštěvníků z areálu. Objednatel ve spolupráci s AD si zajistí PD.

C. BOZP

01KD

Upozornění Zástupce objednatele:

- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s.r.o. , tel: +420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz



-
- ZO požaduje předložit plán BOZP pro realizaci, zajištění ohlášení OIP a zajistit vyvěšení stavebního povolení. **02KD, 03KD – TRVÁ**
-

D. Závěr a poznámky

D1.1 – Všeobecné

01KD

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez odsouhlaseného TePř vč. KZP **nejsou práce povoleny**. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele.
 - **TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. – 02KD, 03KD TRVÁ**
 - Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální projektovou dokumentaci.
-

Příští kontrolní den se bude konat **dne 11.10.2022 od 10:30 hodin** v rámci restaurace Golf Club.

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Návrh řešení trasy A dle bodu B3.6

Jan
Dědeček

Digitálně
podepsal Jan
Dědeček
Datum:
2022.10.10
13:56:58 +02'00'



„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“

Prezenční listina

Příloha č. 1 k Zápisu kontrolního dne stavby č. 3, konaném dne 04.10.2022 v místě předmětné stavby od 10:30 hodin.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	E-mail	Podpis
p. Jan Kuna	Magistrát města Chomutov	Stavební technik	+420 736 663 263	j.kuna@chomutov-mesto.cz	
Mgr. Hana Nováková	Magistrát města Chomutov	Vedoucí odboru rozvoje a investic	420 725 586 172	h.novakova@chomutov.cz	
p. David Dinda	Magistrát města Chomutov	1. náměstek primátora	420 474 637 210	d.dinda@chomutov.cz	
Ing. Jan Dědeček	Contract management, a.s.	Zástupce objednatele	+420 733 733 164	dedecek@cmmanagement.cz	
Ing. et Ing. Adam Černoch	Contract management, a.s.	Projektový ředitel	+420 777 214 363	cernoch@cmmanagement.cz	
Ing. Karel Prokeš	QM-4C, s.r.o.	TDS	+420 737 997 040	prokes@qmanagement.cz	
p. Martin Dušek	Aquagen s.r.o.	TDS	+420 724 166 133	martin.dusek72@gmail.com	
pí. Eva Bambasová	SINNET.EU s.r.o.	Koo BOZP	+420 607 051 250	eva.bambasova@sinneteu.cz	
Ing. arch. Jan Skoupý	Refuel s.r.o.	AD	+420 608 119 965	jan@refuel.cz	
Ing. arch. Zbyněk Ryška	Refuel s.r.o.	AD	+420 736 605 107	zbynek@refuel.cz	
Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS	Refuel s.r.o.	AD	+420 604 844 319	fisla@seznam.cz	
p. Petr Kasper	PETROM STAVBY, a.s.	Předseda představenstva	+420 777 165 578	kasper@petromstavby.cz	
Ing. Tomáš Holan	PETROM STAVBY, a.s.	Zástupce Zhotovitele Projektový manažer	+420 724 209 222	holan@petromstavby.cz	
p. Jan Opat	PETROM STAVBY, a.s.	Stavbyvedoucí	+420 702 154 002	opat@patromstavby.cz	
p. Martin Rychtecký	PETROM STAVBY, a.s.	Stavbyvedoucí	+420 774 334 124	martin.rychtecky@rrr-cv.cz	
p. Jiří Blochin	Silnice Topolany a.s.	Stavbyvedoucí	+420 602 233 080	blochin@silnicetopolany.cz	
Anna Roučková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 722 511 458	rouckova@kapatelier.cz	
Gabriela Blašková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 733 737 535	blaskova@kapatelier.cz	
Ilona Šrytr	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 776 552 290	ilonasytr@kapatelier.cz	
Jarmila Roučová	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 702 029 010	roucova@kapatelier.cz	
Jiří Gaudl	IDEAFACORY s.r.o.	konzultant data	+420 603 287 642	info@idfa.cz	
Adam Studený	Studený s.r.o.		+420 603 573 973	adam@skolky-studený.cz	

