
	<b>Evidenční list vyhrazené změny (Doměrky) dle § 100 ZZVZ</b>		
	<b>Název stavby:</b>	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	<b>Číslo Změnového listu:</b>	ZL 49	
	<b>Číslo SO/PS:</b>	SO 01	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru:</b>	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ		
<b>Objednatel:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	<b>Zhotovitel:</b>	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
<b>Předmět změny:</b>	Doměrky komunikací ze žulové dlažby a asfaltu včetně podkladních vrstev a zemních prací		
<b>Iniciátor změny:</b>	Zhotovitel/Objednatel		
<b>Popis změny:</b> (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	<b>Zdůvodnění změny:</b> Veškeré plochy komunikací byly geodeticky zaměřeny (GZ) (viz. geodetický protokol). Asfaltových komunikací bylo provedeno 905,30 m2 dle GZ. Dle GZ dlážděná komunikace Přemyslova a sjezdy z kostek 15/17 zdlážděno 401,77 m2 . Dle GZ zdlážděná plocha z dlažby 8/10 zdlážděno 3102 m2 (včetně SO 02.9 10 m2 + ZL12 132 m2), tzn. 3102-10-132=2960 m2 oproti projektovaným 2 848,57 m2 – rozdíl 111,43 m2 (vícepráce).  <b>Nové řešení :</b> Asfaltových komunikací bylo provedeno dle GZ 905,30 m2 oproti projektovaným 898,58 m2, tzn. vícepráce +6,72 m2, včetně podkladních vrstev a sanace aktivní zóny. Dle GZ dlážděná komunikace Přemyslova a sjezdy z kostek 15/17 zdlážděno 401,77 m2 oproti projektovaným 431,09 m2, tzn. méněpráce -29,32 m2, včetně podkladních vrstev a sanace aktivní zóny. Dle GZ zdlážděná plocha z dlažby 8/10 zdlážděno 3102 m2 (včetně SO 02.9 10 m2 + ZL12 132 m2), tzn. 3102-10-132=2960 m2 oproti projektovaným 2 848,57 m2, tzn. vícepráce +111,43 m2, včetně podkladních vrstev a sanace aktivní zóny  <b>Zdůvodnění pro zařazení změny :</b> Vyhrazené změny (Doměrky) byly stanoveny měřením na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací viz. příložené geodetické zaměření. Tyto změny neznamenají změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravují, respektive upřesňují, řešení uvažované v zadávací dokumentaci z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů. Předmětné práce lze v souladu s § 100 ZZVZ resp. s ohledem na § 7 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver.1.5 definovat jako vyhrazené změny (doměření prací), které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.		
<b>Odkazy na výkresy:</b>	<b>Dopad do celkových termínů:</b>	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
<b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>	Odpočty v Kč bez DPH	-44 859,60 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	247 105,68 Kč	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>202 246,08 Kč</b>	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	42 471,68 Kč	
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>244 717,76 Kč</b>	
	<b>Jméno:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Zástupce objednatele:</b>	Ing. Jan Dědeček		
<b>Objednatel:</b> osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	David Dinda		
	Mgr. Hana Nováková		
<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Tomáš Holan		

	<b>ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>		
	<b>Název stavby:</b>	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	<b>Číslo Změnového listu:</b>	ZL 49	
	<b>Číslo SO/PS:</b>	SO 01	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru:</b>	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ		
<b>Objednatel:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	<b>Zhotovitel:</b>	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
<b>Předmět změny:</b>	Změna typu obrub, poklop nad kabelovou šachtou, odpadkové koše		
<b>Iniciátor změny:</b>	Zhotovitel/Objednatel		
<b>Popis změny:</b> (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)  Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	<b>Zdůvodnění změny:</b> 1. V zadávací dokumentaci byly na začátku a konci Přemyslovky ulice navrženy betonové obruby (viz. PD změny). Vzhledem k tomu, že celá rekonstruovaná část Přemyslovky ulice i okolních ploch náměstí a parkoviště je ze žulových obrub a ze žulových dlažeb, AD doporučil a Objednatel odsouhlasil záměnu betonových obrub za žulové obruby šířky 250 mm. 2. V zadávací dokumentaci nebyl řešen poklop nad kabelovou šachtou pro datové kabely u SO 05 (viz. PD změny). Dle požadavku Objednatele byl nad touto šachtou proveden větší poklop 800x800mm, z důvodu možnosti otevření plastového poklopu kabelové šachty pod ním. 3. Dle požadavku Objednatele byly dodány odpadkové koše ze skladu objednatele v počtu 4 ks, byla odečtena původní kompletní položka dodání a montáže košů a přičtena položka pouze osazení košů. Počet košů byl dodržen. 4. V PDPS nebyly řešeny stávající kanalizační šachty. Dle požadavku SČVK na konci stavby, byla doplněna roznášecí železobetonová deska pod poklop revizní šachty kanalizace. Protože plocha byla již zadlážděná, rozebrala se dlažba 8/10, odstranily se podkladní vrstvy v tl. 17 cm, odstranil se poklop, provedla se podkladní železobetonová deska, na kterou ze zpětně osadil odstraněný poklop a plocha se zpět zadlážděla.  <b>Nové řešení :</b> 1. Na začátku a konci Přemyslovky ulice (viz. PD změny) byly osazeny žulové obruby šířky 250 mm v celkové délce 23 m. 2. Nad kabelovou šachtou pro datové kabely u SO 05 (viz. PD změny) byl osazen 1 poklop 800x800mm. 3. Odpadkové koše byly dodány ze skladu objednatele, montáž košů provedl Zhotovitel. Počet košů požadovaný v PDPS byl dodržen (4 kusy). 4. Kolem poklopu se rozebrala žulová dlažba 8/10 a odstranily se podkladní vrstvy v tl. 17 cm v ploše 1,967 m <sup>2</sup> a demontoval se stávající poklop. Dále se provedla se podkladní železobetonová deska 0,334 m <sup>3</sup> , osadil se zpět kanalizační poklop a komunikace se zpět zadlážděla v ploše 1,967 m <sup>2</sup> .  <b>Zdůvodnění pro zařazení změny :</b> Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Výše uvedené změny byly provedeny nad rámec zadání dle požadavku Objednatele, použití žulových obrub sjednotí typ obrub v celé stavbě, osazení poklopu 800x800mm je nutné z důvodu zakrytí šachty pro datové rozvody , odpadkové koše dodá Objednatel se svých zásob, roznášecí žbt deska zamezí možnému propadu poklopu kanalizační šachty v budoucnosti. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračují limit 15% původní hodnoty zakázky a jejich hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změny byly zařazeny dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
<b>Odkazy na výkresy:</b>	<b>Dopad do celkových termínů:</b>	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
<b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>	Odpočty odst. 4 v Kč bez DPH	-57 302,40 Kč	
	Přípočty odst. 4 v Kč bez DPH	63 901,42 Kč	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>6 599,02 Kč</b>	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	1 385,79 Kč	
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>7 984,81 Kč</b>	
	<b>Jméno:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Zástupce objednatele:</b>	Ing. Jan Dědeček		
<b>Autorský dozor:</b>	Ing.arch. Zbyněk Ryška		
<b>Objednatel:</b> osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	David Dinda		
	Mgr. Hana Nováková		
<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Tomáš Holan		

Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet ZL 49	9/4
	Přehled nových položek	1/13
	Kalkulace nové položky - poklop	1/14
	Cenová nabídka poklop	2/15
	Technický list poklop	1/17
	Přehled zařazení změn do skupin	1/18
	Oznámení Variace č.49	1/19
	Geodetické zaměření ploch	2/20
	PD změny obrub a poklop	1/22
	Email koše	2/23
	Foto roznášecí žbt deska nad kanalizační šachtou	1/25

REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba:

P/055/22  
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z  
ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:  
Místo:

Chomutov

CC-CZ:  
Datum:

28. 7. 2022

Zadavatel:  
Statutární město Chomutov

IČ:  
DIČ:

00261891  
CZ00261891

Zhotovitel:  
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

IČ:  
DIČ:

26769611  
CZ26769611

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			208 845,10
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 208 845,10	Výše daně 43 857,47
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		252 702,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P/055/22		
Stavba:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže		
Místo:	Chomutov	Datum:	28. 7. 2022
Zadavatel:	Statutární město Chomutov	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero - Přemyslova	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů		208 845,10	252 702,57
SO 01	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / ZL49	208 845,10	252 702,57
MNP1	Měněpráce doměrky skupina 1	-44 859,60	-54 280,12
MNP2	Měněpráce odstavec 4 ZZVZ	-57 302,40	-69 335,90
VCP1	Vícepráce doměrky skupina 1	247 105,68	298 997,87
VCP2	Vícepráce odstavec 4 ZZVZ	63 901,42	77 320,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / ZL49

Soupis: MNP1 - Méněpráce doměrky skupina 1

Místo: Chomutov Datum: 28. 7. 2022  
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -44 859,60

D 5 Komunikace -44 859,60

1	K	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Kamenná kostka žulová šedá jemnozrná „kočičí hlavy“ 15/17 cm	M2	-29,320	1 530,00	-44 859,60	SO 01
---	---	-------	---	----	---------	----------	------------	-------

P	<p>Poznámka k položce:</p> <p>Poznámka k položce: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>							
VV	Dle geodetického zaměření							
VV	401,77-431,09					-29,320		
VV	Součet					-29,320		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / ZL49

Soupis: MNP2 - Méněpráce odstavec 4 ZZVZ

Místo: Chomutov Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -57 302,40

D		9	Ostatní konstrukce a práce			-57 302,40		
1	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-23,200	457,00	-10 602,40	SO 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. viz Situace: 23,2=23,200 [A] -23,2 Součet					
VV						-23,200		
VV						-23,200		
VV						-23,200		
2	K	93753	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY Typ 1 - odpadkový koš pro psí exkrementy celooceľový, specifikace viz projektová dokumentace	KUS	-1,000	14 800,00	-14 800,00	SO 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku					
VV			viz Situace mobiliář: 1ks=1,000 [A]ks					
VV			-1,0			-1,000		
VV			Součet			-1,000		
3	K	93753.2	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY Typ 3 - trojitý odpadkový koš celooceľový, specifikace viz projektová dokumentace	KUS	-1,000	31 900,00	-31 900,00	SO 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku					
VV			viz Situace mobiliář: 1ks=1,000 [A]ks					
VV			-1,0			-1,000		
VV			Součet			-1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt:SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / ZL49

Soupis:VCP1 - Vícepráce doměrky skupina 1

Místo:

Datum:28. 7. 2022

Zadavatel:Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

247 105,68

D0Všeobecné konstrukce a práce

11 678,56

1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkopek/nestmelené podkladní vrstvy	T	145,982	80,00	11 678,56	SO 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		předpoklad:					
	VV		"z pol. 11343: " 28,252*2		56,504			
	VV		"z pol. 12373:" 44,405*2		88,810			
	VV		"z pol. 16275115:" 0,334*2		0,668			
	VV		Součet		145,982			

D1Zemní práce

19 715,29

2	K	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU (s vyzískaným mat. s asf. pojivy je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)	M3	28,252	375,00	10 594,50	SO 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		Dle geodetického zaměření					
	VV		"asfaltové plochy" 6,7*0,47		3,149			
	VV		"dlažba K8/10" 111,43*0,37		41,229			
	VV		"dlažba K15/17" -29,32*0,55		-16,126			
	VV		Součet		28,252			
3	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	44,405	175,00	7 770,88	SO 01

	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
	VV		sanace podloží dle geodetického zaměření					
	VV		(6,7+111,43-29,32)*0,5		44,405			
	VV		Součet		44,405			

4	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	88,810	15,20	1 349,91	SO 01
---	---	-------	---	----	--------	-------	----------	-------

	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
	VV		v rozsahu nových zpevněných ploch: dle geodetického					
	VV		6,7+111,43-29,32		88,810			
	VV		Součet		88,810			

D2Základy

4 618,12

5	K	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Min. 400 g/m2	M2	88,810	52,00	4 618,12	SO 01
---	---	-------	-------------------------------------	----	--------	-------	----------	-------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>					
	VV		v rozsahu nových zpevněných ploch: dle geodetického					
	VV		6,7+111,43-29,32		88,810			
	VV		Součet		88,810			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				198 450,72	
6	K	567301	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA	M3	1,156	1 050,00	1 213,80	SO 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		Dle geodetického zaměření asfaltové plochy					
	VV		6,7*1,15*0,15		1,156			
	VV		Součet		1,156			
7	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32	M3	18,936	900,00	17 042,40	SO 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		Dle geodetického zaměření					
	VV		"asfaltové plochy" 6,7*0,2		1,340			
	VV		"dlažba K8/10" 111,43*0,25		27,858			
	VV		"dlažba K15/17" -29,32*0,35		-10,262			
	VV		Součet		18,936			
8	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6 kg/m2	M2	6,720	21,00	141,12	SO 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		Dle geodetického zaměření					
	VV		905,3-898,58		6,720			
	VV		Součet		6,720			
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2	M2	6,720	15,00	100,80	SO 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		Dle geodetického zaměření					
	VV		905,3-898,58		6,720			
	VV		Součet		6,720			
10	K	5774AD	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11	M3	0,269	5 600,00	1 506,40	SO 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</i>					
	VV		Dle geodetického zaměření					
	VV		(905,3-898,58)*0,04		0,269			
	VV		Součet		0,269			
11	K	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S ACP 16+	M3	0,468	5 100,00	2 386,80	SO 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</i>					
	VV		Dle geodetického zaměření					
	VV		"S6 komunikace v areálu:" (160,3-156,82)*0,06		0,209			
	VV		"S8 komunikace Maroldova:" (729+16-741,76)*0,08		0,259			
	VV		Součet		0,468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	58221.1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Kamenná kostka žulová mix jemnozrnná 8/10 cm, okolo stromů bude proveden pás jiné barvy (šedá)	M2	111,430	1 580,00	176 059,40	SO 01
<div>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>								
P								
VV			Dle geodetického zaměření mínus VV SO01 mínus ZL12 mínus SO02.9					
VV			3102-375,43-2473,14-132-10		111,430			
VV			Součet		111,430			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 642,99	
13	K	21450r	SANAČNÍ VRSTVY Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU	M3	44,405	284,72	12 642,99	ZL 3
VV			sanace podloží dle geodetického zaměření					
VV			(6,7+111,43-29,32)*0,5					
VV			Součet					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / ZL49

Soupis: VCP2 - Vícepráce odstavec 4 ZZVZ

Místo: Chomutov Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 63 901,42

D 1 Zemní práce 1 404,37

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	1,967	69,40	136,51	SO 05a
	VV		Roznášecí deska pod poklop požadavek SčVK					
	VV		1,5*1,5-3,14*0,3*0,3		1,967			
	VV		Součet		1,967			
2	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1,967	614,00	1 207,74	SO 05a
	VV		Roznášecí deska pod poklop požadavek SčVK					
	VV		1,5*1,5-3,14*0,3*0,3		1,967			
	VV		Součet		1,967			
3	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	0,334	180,00	60,12	SO 05a
	VV		Odvoz na skládku					
	VV		Roznášecí deska pod poklop požadavek SčVK					
	VV		(1,5*1,5-3,14*0,3*0,3)*0,17		0,334			
	VV		Součet		0,334			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 456,24	
4	K	45138	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE Konstrukční bet. výztuž. kari sítí	M3	0,334	4 360,00	1 456,24	SO 01

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže

VV Roznášecí deska pod poklop požadavek SčVK  
VV (1,5\*1,5-3,14\*0,3\*0,3)\*0,17  
VV Součet

0,334  
0,334

D 5 Komunikace pozemní 61 040,81

5	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1,967	621,00	1 221,51	SO 02.9
	VV		Zpětné zadláždění kolem poklopu pro zhotovení roznášecí desky					
	VV		1,5*1,5-3,14*0,3*0,3		1,967			
	VV		Součet		1,967			

D 8 Trubní vedení 7 839,30

6	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	SO 03
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Poklop nad šachtou pro datové kabely u infocentra" 1		1,000			
	VV		"Poklop kanalizační šachty nad roznášení deskou" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	513,00	513,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Demontáž poklopu kanalizační šachty nad roznášecí deskou					
	VV		1		1,000			
8	M	286R1	Poklop B125 QUATTRO 800 čtvercový, JS 702x702	kus	1,000	5 246,30	5 246,30	kalkulace
D 9			Ostatní konstrukce a práce				51 980,00	
9	K	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 250/200 mm	M	23,000	2 120,00	48 760,00	SO 01
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		Místo betonových obrub na začátku a konci Přemyslový ulice					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
10	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	805,00	3 220,00	SO 03.1
	VV		Osazení košů 1x Maroldova, 2x Přemyslova, 1x náměstí					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

## PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZL 49

[illegible]

# FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

položka č.

7

číslo položky	popis	m.j.
286R1	Poklop B125 QUATTRO 800 čtvercový, JS 702x702	kus

MATERIÁL - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
	Poklop B125 QUATTRO 800 čtvercový	kus	1,000	4 562,00	4 562,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					4 562,00

MZDY				
číslo zaměstnání	název zaměstnání	počet Nh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
mezisoučet - mzdy celkem bez poj.				0,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M				0,00
CELKEM MZDY - M				0,00

STROJE				
číslo stroje	název stroje	počet Nh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
CELKEM STROJE - S				0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY	MJ	počet	sazba	Kč
				0,00
				0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN				0,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN)	228,10
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z(H+M+S+OPN)	228,10
ZISK - Z=5% z(H+M+S+OPN)	228,10
CENA VYPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z	5 246,30

REKAPITULACE NÁKLADU								
H	M	S	OPN	RV	RS	Z	CV	CZ
hmoty	mzdy	stroje	ost.p.nákl.	režie výr.	rež.správ.	zisk	cena vyp.	cena zaokr.
4 562,00	0,00	0,00	0,00	228,10	228,10	228,100	5 246,30	5 246,30

Vypracoval: Blochin Jiří

## Jiří Blochin

---

**Od:** Tomáš Holan <holan@petromstavby.cz>  
**Odesláno:** čtvrtek 1. června 2023 10:19  
**Komu:** Jiří Blochin  
**Předmět:** FW: Poklop  
**Přílohy:** IMG\_20230529\_0002.pdf; IMG\_20230529\_0003.pdf

**Utajení:** důvěrné

Odesláno z mého zařízení Galaxy

----- Původní zpráva -----

Od: Saniba-účetárna <saniba@saniba.cz>  
Datum: 29.05.23 13:41 (GMT+01:00)  
Komu: Tomáš Holan <holan@petromstavby.cz>  
Předmět: RE: Poklop

Dobré odpoledne,

<i>Materiál</i>	<i>Množství</i>	<i>Cena za MJ</i>
Poklop B125 QUATTRO 800 čtvercový, JS 702x702	1 ks	4 562,-
Poklop B125 UNO 900 JS 800x800	1 ks	8 253,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Kruhové poklopy aktuálně neumíme v DN700-800.  
Při objednání výše uvedeného dodání zítra odpoledne.  
Katalogový list přílohou.

Přeji hezký start do nového týdne

**Bc. Kateřina Vrbová**  
**Saniba, s.r.o.**  
Husitské náměstí 558, Žatec  
<http://www.saniba.cz/>



---

**From:** Tomáš Holan [mailto:holan@petromstavby.cz]  
**Sent:** Thursday, May 25, 2023 4:11 PM  
**To:** saniba@saniba.cz  
**Subject:** Poklop  
**Importance:** High  
**Sensitivity:** Confidential

Dobrý den,

Prosím o zaslání možné dodávky poklopu pr. 700, nebo 800mm – vnitřní světlost.  
Jedná se o poklop v trávniku – bez požadavku na zatížení, plně postačuje tř. zatížení A.  
Důležitá je rychlost dodání / vyzvednutí. Ideálně zítra tj. v pátek 26.5. nebo v pondělí 29.5.2023, nutně ho potřebujeme 30.5. osadit.  
Je možnost si vyzvednout i někde v Praze.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

**Ing. Tomáš Holan**

projektový manažer

mobil: 724 209 222

e-mail: [holan@petromstavby.cz](mailto:holan@petromstavby.cz)



**PETROM STAVBY, a. s.** | Běchovická 701/26 | 100 00 Praha 10 | CZ  
IC: 267 69 611 | DIČ CZ699006672 | spisová značka B20765 u Městského soudu v Praze  
**Korespondenční adresa: Tušimice 34 | 432 01 Kadaň**  
ID DS: 6jks4we | web: [www.petromstavby.cz](http://www.petromstavby.cz)  
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018

*Dovolujeme si Vám oznámit, že společnost **PETROM STAVBY, a.s.** má s účinností od **1. ledna 2023** nové daňové identifikační číslo (DIČ) **CZ699006672**, ovšem výhradně pro účely daně z přidané hodnoty (DPH).*

*Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že se společnost PETROM STAVBY, a.s. stává členem skupiny pro účely DPH ve smyslu ustanovení §5a zákona o DPH.*


*Členem skupiny je i společnost Silnice Topolany a.s. (IČO: 05758734) a společnost PETROMA KAMENOLOMY s.r.o. (IČO: 08859591).*

*Zadejte si, prosím, naše nové DIČ pro účely DPH do Vašeho informačního systému a uvádějte jej na všech daňových dokladech, do kontrolního hlášení pro účely DPH a na dalších dokumentech, kde jste dosud uváděli původní DIČ (např. smlouvy, objednávky, zálohové faktury, atd.)*

*Upozorňujeme, že v případě použití starého DIČ na dokladech s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2023, Vám budeme nuceni doklady vrátit zpět a může tak dojít ke zpoždění platby i problémům v kontrolním hlášení.*



## POKLOP B125 QUATTRO 800 - ČTVERCOVÝ

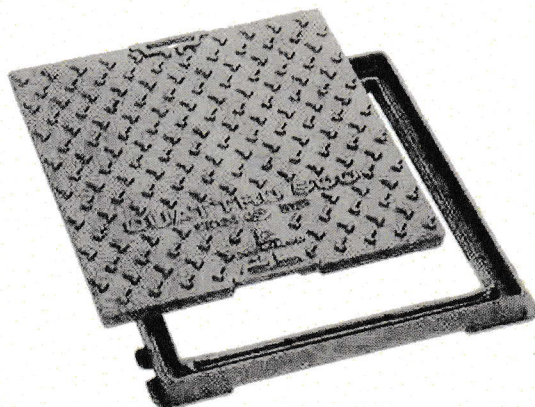

Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124		B125

### Čtvercový poklop Js 700 x 700 mm

#### Rozměry

celková délka: 800 mm  
celková šířka: 800 mm  
světlost: 700x700 mm  
výška: 42 mm

#### Víko

bezpečnostní protiskluzový povrch  
typ 4L  
hmotnost víka: 44kg


#### Materiál

víko a rám z tvárné litiny ISO 1083,  
EN 1563

Černý netoxický vodou ředitelný nátěr.

#### Ostatní rozměry a provedení:

QUATTRO 400 (Js 300 x 300 mm)  
QUATTRO 500 (Js 400 x 400 mm)  
QUATTRO 600 (Js 500 x 500 mm)  
QUATTRO 600 VOTC (Js 500 x 500 mm) uzamykat..  
QUATTRO 700 (Js 600 x 600 mm)  
QUATTRO 700 VOTC (Js 600 x 600 mm) uzamykat..  
QUATTRO 800 (Js 700 x 700 mm)

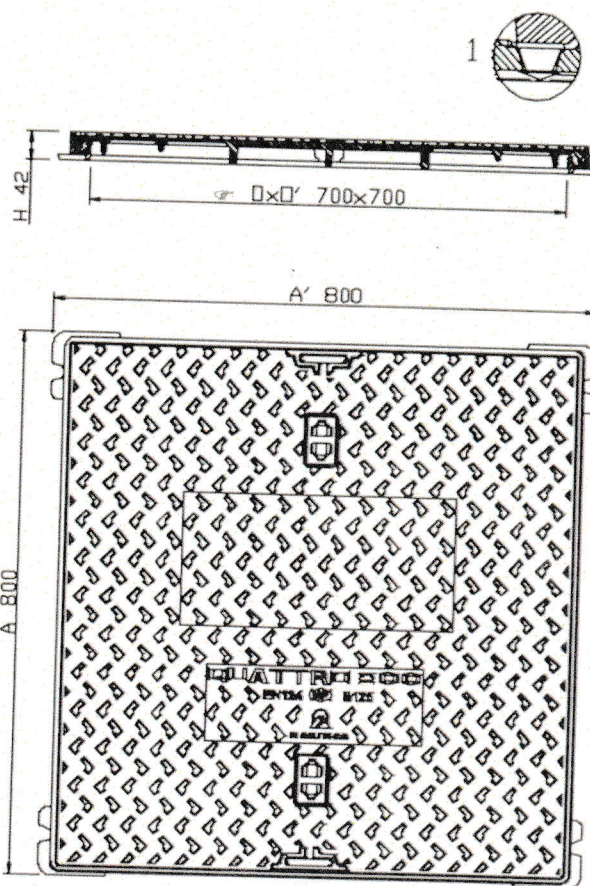

Katalogové číslo: 522071

Materiál: ISO 1083/ EN 15631

Hmotnost: 59 kg



**Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327**

**OK v limitu**

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

**Statutární město Chomutov  
Ing. Jan Dědeček  
Zástupce Objednatele**

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 04.09.2023

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

**Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže****Věc: Aktualizace 2 Oznámení Variace č.49 – změny SO 01 – upřesnění výměr**

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. d202200327 na akci Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, dle Smluvních podmínek, čl. 12.1, oznamuji Zhotovitel Aktualizaci 2 Variace č.49, která se týká změn v SO 01.

Rekapitulace Variace č.49:

1. V zadávací dokumentaci byly na začátku a konci Přemyslovy ulice navrženy betonové obruby (viz. PD). Vzhledem k tomu, že celá rekonstruovaná část Přemyslovy ulice i okolních ploch náměstí a parkoviště je ze žulových obrub a ze žulových dlažeb, AD doporučil a Objednatel odsouhlasil záměnu betonových obrub za žulové obruby šířky 250 mm.
2. V zadávací dokumentaci nebyl řešen poklop nad kabelovou šachtou pro datové kabely u SO 05 (viz. PD). Nad touto šachtou byl proveden větší poklop 800x800mm, z důvodu možnosti otevření plastového poklopu kabelové šachty pod ním.
3. Dle požadavku Objednatele byly dodány odpadkové koše ze skladu objednatele v počtu 4 ks, byla odečtena původní kompletní položka dodání a montáže košů a přičtena položka pouze osazení košů. Počet košů byl dodržen.
4. Dle požadavku SČVK byla doplněna roznášecí železobetonová deska pod poklop revizní šachty kanalizace. Protože plocha byla již zdlážděná, rozebrala se dlažba 8/10, odstranily se podkladní vrstvy v tl. 17 cm, provedla se podkladní železobetonová deska a plocha se zpět zdláždila
5. Veškeré plochy byly geodeticky zaměřeny (GZ) (viz. geodetický protokol).  
Dle GZ dladěná komunikace Přemyslova a sjezdy z kostek 15/17 zdlážděno 401,77 m2 oproti projektovaným 431,09 m2, tzn. méněpráce -29,32 m2.  
Dle GZ zdlážděná plocha z dlažby 8/10 zdlážděno 3102 m2 (včetně SO 02.9 10 m2 + ZL12 132 m2), tzn. 3102-10-132=2960 m2 oproti projektovaným 2 848,57 m2 – **rozdíl 111,43 m2** (vícepráce).  
Zdůvodnění: ve výkazu výměr chyběly plochy oproti ZDS  
Průchod SO 05 –  $8 \times 1,85 = 14,80$  m2  
Kóje pro kola SO 05 –  $20 \times 2,05 = 41$  m2  
Průchod SO 05a –  $3,99 \times 2,54 = 10,134$  m2  
Změna výjezdu z parkoviště zúžení na 3 m –  $3 \times 3,1 + 3 \times 0,35 = 11,25$  m2  
Zbývající část – doměrek –  $111,43 - 14,8 - 41 - 11,25 = 34,246$  m2

Zhotovitel předkládá aktualizovaný rozpočet č.2 Variace č.49 ve výši **207.452,10 Kč bez DPH**.

V souvislosti s touto aktualizací Variace budeme nárokovat prodloužení Doby pro dokončení o 16 pracovních dní.

Přílohy: Aktualizovaný Rozpočet Variace č.49

**SILNICE TOPOLANY a.s.**

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČ: 057 58 734, DIČ: CZ699006672

Jiří Blochin

Příprava stavby



## DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

**1.Název zakázky:** Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže Kamencové jezero v Chomutově – výměry ploch

**2. Zhotovitel:** Ing. Milan Větrovský, Ph.D., Rašovická 731, Klášterec nad Ohří

**3. Objednatel:** PETROM STAVBY, a.s. Běchovická 701/26, Praha 10

**4. Kraj:** Ústecký

**5. Obec:** Chomutov

**6. Katastrální území:** Chomutov I

**7. Předmětem je zaměření ploch s následujícími výslednými výměrami:**

díly	živice m2	díly	kostka 8/10 m2	díly	pakovací stání m2	díly	kostka 15/17 m2
1	729	1	835.26	1	195.73	1	393.34
2	160.3	2	272.83	2	337.77	2	8.43
3	16	3	494.72	3	140.37	celkem	401.77
celkem	905.3	4	165.3	4	406.99		
		5	123.89	5	284.15		
		6	265.8	6	235.64		
		7	164.55	7	151.26		
		8	52	celkem	1752		
		9	15.09				
		10	49.77				
		11	14.8				
		12	467.24				
		13	5.41	díly	parkoviště 15/17 m2		
		14	156.3	1	1755.4		
		15	19.33				
		celkem	3102				

Plochy byly určeny v SW AUTOCAD.

### CELKOVÁ REKAPITULACE

**Asfaltové plochy – 905.3 m2**

**Parkoviště dlažba 15/17 - 1755.4 m2**

**Přemyslova ul. a vjezdy dlažba 15/17 - 401.77 m2**

**Dlažba 8/10 - 3102 m2**

**Parkovací stání štěrkové travníky - 1752 m2**

## 8. Geodetické práce, způsob provedení měření:

Měření podrobných bodů bylo prováděno kombinací technologie GNSS a polární metody kalibrovanou totální stanicí Trimble S5 DR plus, výrobní číslo 37110537.

Při technologii GNSS bylo měřeno přístrojem TRIMBLE R12i, S/N 6043F00228 P/N 90914-00. Pro vyhodnocení byl použit modul zpřesněné globální transformace TRIMBLE 2018 dodaný společností GEOTRONICS Praha pro transformaci mezi novou realizací ETRS89, schválenou Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním pro transformaci souřadnic podrobných bodů určených pomocí technologií GNSS.


**9. Souřadnicový systém:** - jednotná trigonometrická síť katastrální - S-JTSK

**10. Výškový systém** – Balt po vyrovnání - Bpv

**11. Přesnost měření:** zaměření stanovisek je dána použitou technologií GNSS. V průběhu měření činil PDOP  $S_{xy}P = 0.015$ ,  $S_zV = 0.025$ .

Přesnost měření polohopisu činí  $\pm 0.06$  m a výškopisu činí  $\pm 0.04$  m vůči geodetickým základům.

**12. Náčrt zaměřených ploch-nedílnou přílohou je soubor \*.dwg**

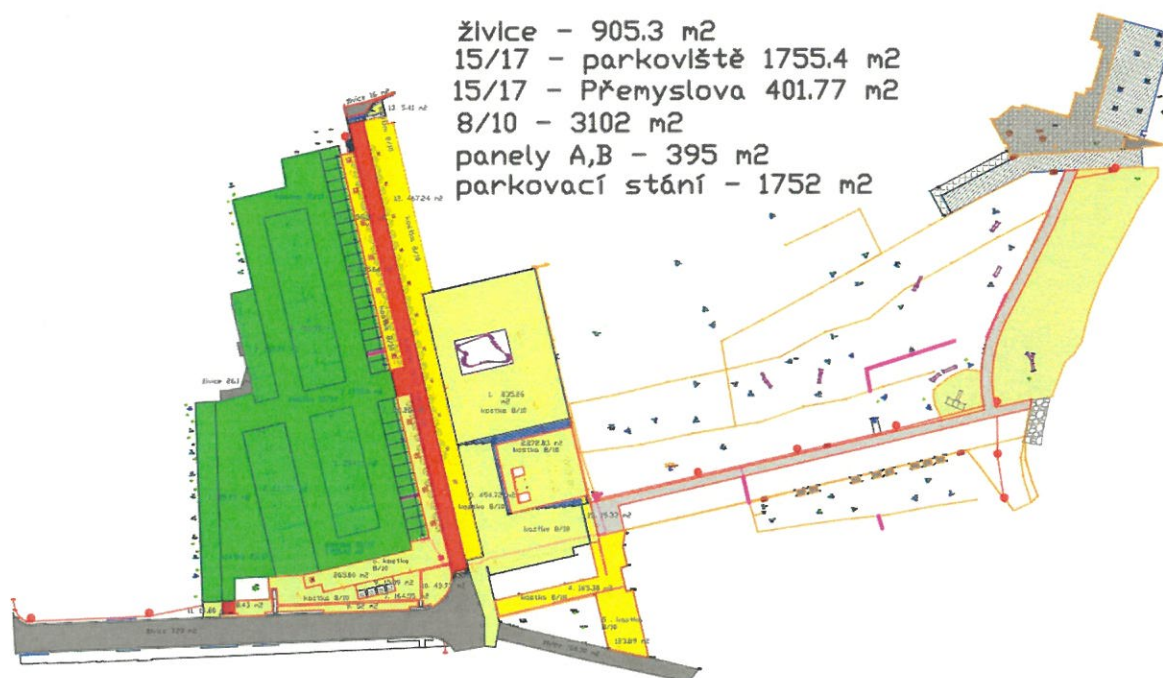

V Klášterci nad Ohří 31.05.20232

Zpracoval:

Ing. Milan Větrovský, Ph.D.  
zeměměřický inženýr č. 2902/2020


č.ověř DSPS: 36/2023



Náležitostmi a přesností odpovídá  
právním předpisům



✱ ZÁMĚNA BETONOVÝCH OBROB ZA ŽULOVÉ s. 250 mm

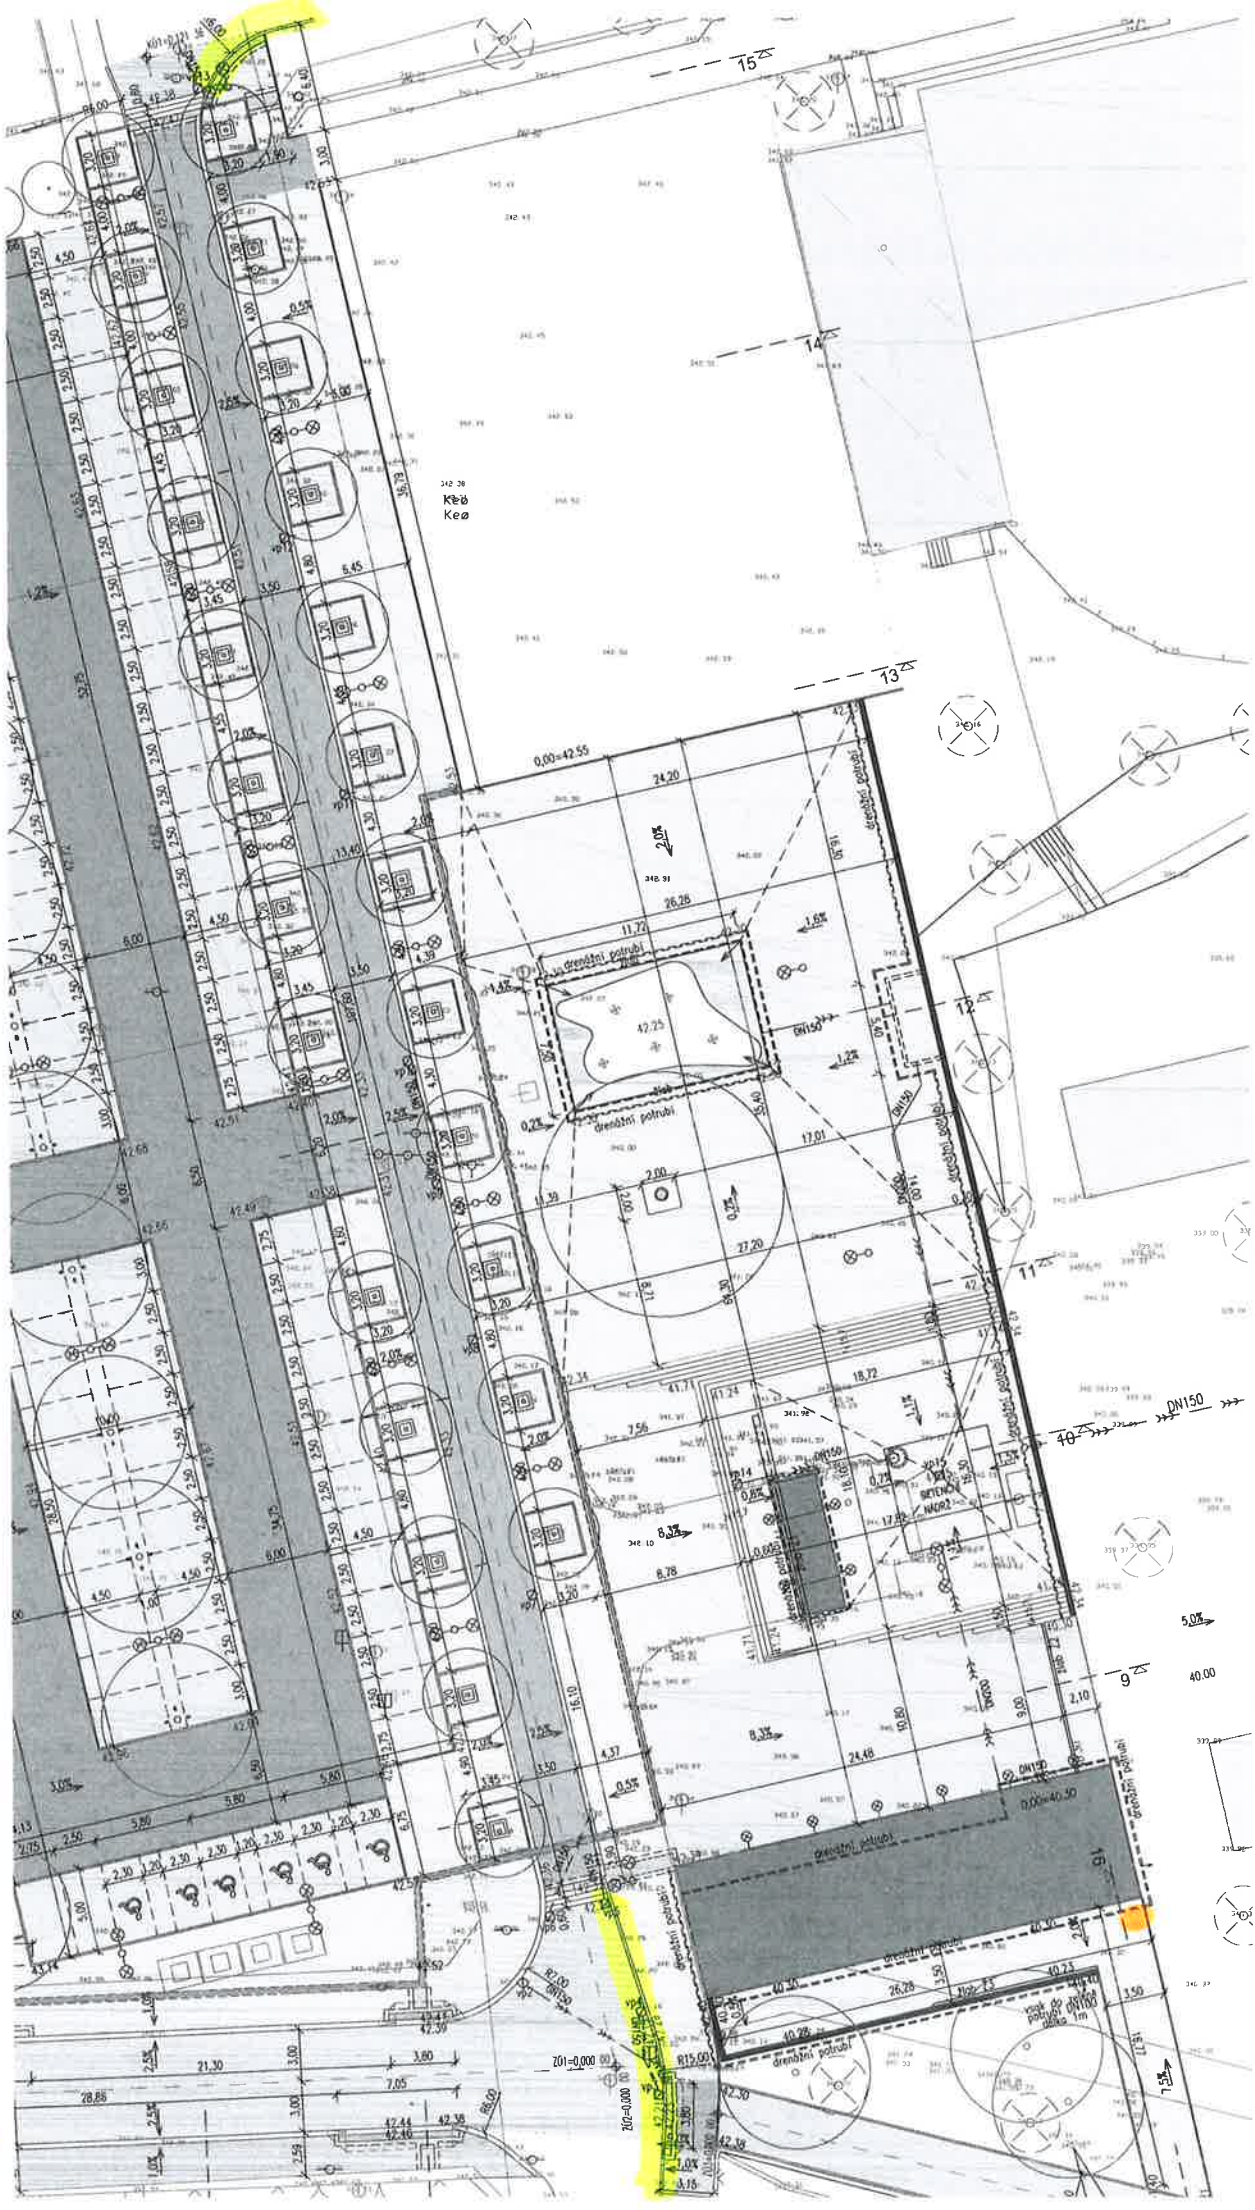

✱ NOVÝ POKLAD 800 x 800 NAD DATOVOU SÁDKOU

## Jiří Blochin

---

**Od:** Nováková Hana <h.novakova@chomutov.cz>  
**Odesláno:** úterý 31. ledna 2023 17:00  
**Komu:** Jiří Blochin  
**Kopie:** Zbynek; Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS. (fisla@seznam.cz); j.justra  
**Předmět:** koše..

Dobrý den, pane Blochine,  
prošla jsem si všechny PD (Přemyslova, pláž, Mostecká), co se košů týče. Pokud to shrnu, tak PD uvažuje o třech typech košů:

TYP 1 – jednoduchý úzký koš v PD na psí exkrementy:	1 ks Přemyslova/náměstí + 1 ks Mostecká
TYP 2 – širší koš samostatně stojící (43 cm široký/55 l):	22 ks Pláž
TYP 3 – široký koš dvojdílný (komunál + plast – 86 cm široký):	1 ks Přemyslova/náměstí + 5 ks Mostecká

### TYP1

### TYP2

### TYP3

#### Objednáno a naskladněno máme:

TYP 1 – 2 ks, ale pro běžný odpad  
TYP 2 – 24 ks, z toho 15 komunální odpad a 9 plast  
TYP 3 – 0 ks

Takže za mě návrh je takový, že to, co máme objednáno, by nám mohlo vystačit, předběžný návrh následující:

Přemyslova/náměstí: namísto 1xTYP1 a 1xTYP 3 se umístí 2xTYP 2  
Pláž: namísto 22xTYP 2 se umístí 20xTYP2 (toho 11xběžný odpad a 9xplast) – i tak to představuje asi trojnásobný nárůst objemu nádob košů oproti stávajícímu stavu  
Mostecká: namísto 1xTYP 1 a 5xTYP 3 se umístí 2xTYP1 pro běžný odpad a 2xTYP2

Finální rozmístění můžeme dohodnout na některém z dalším KD.

Hezký den.

Hanka



**Mgr. Hana NOVÁKOVÁ**  
Odbor rozvoje a investic  
náměstí 1. máje 1, č. dveří 39  
[h.novakova@chomutov.cz](mailto:h.novakova@chomutov.cz)  
Tel.: 474 637 241  
Mob.: 725 586 172

**Magistrát města Chomutova**

**Upozornění:**

Toto sdělení není nabídkou k uzavření smlouvy a ani se nejedná o souhlas s uzavřením smlouvy. Každá smlouva musí být uzavřena v písemné formě a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte odesílatele jeho vrácením a ve svém informačním systému jej vymažte.



