


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	5	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD + ZL:	158 dní 8.5.2025	
	Termín dle ZL. č. 5	+3 dny	
	Nový termín:	161 dní, 11.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	150 732,00 Kč	
	Celkem bez DPH	150 732,00 Kč	
	DPH	31 653,72 Kč	
	Celkem včetně DPH	182 385,72 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele:		13.1.2025	
Autorský dozor:		13.1.2025	
Objednatel:		15.1.2025	
osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		13.1.2025	
Zhotovitel:		13.1.2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
	Číslo zakázky : MIR 24026/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	30.10.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	31.10.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Doplnění vrstvy ŠD u chodníkových obrubníků			
			ZBV č.5
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Při vytrhávání chodníkových obrub byla zjištěna skutečnost, že se pod obrubami a podél obrub nachází nadměrné množství betonu. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit a ztuhnout prostor pod obrubami a podél obrub vrstvou šterkodrti.			
POPIS / SCHÉMA :			
<u>doplnění vrstvy ŠD u chodníkových obrubníků</u>			
SO 100 položka 005 č.39	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm	248,85	m²
	0,35*711		
SO 100 položka 005 č.57	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 80 mm	213,30	m²
	0,3*711		





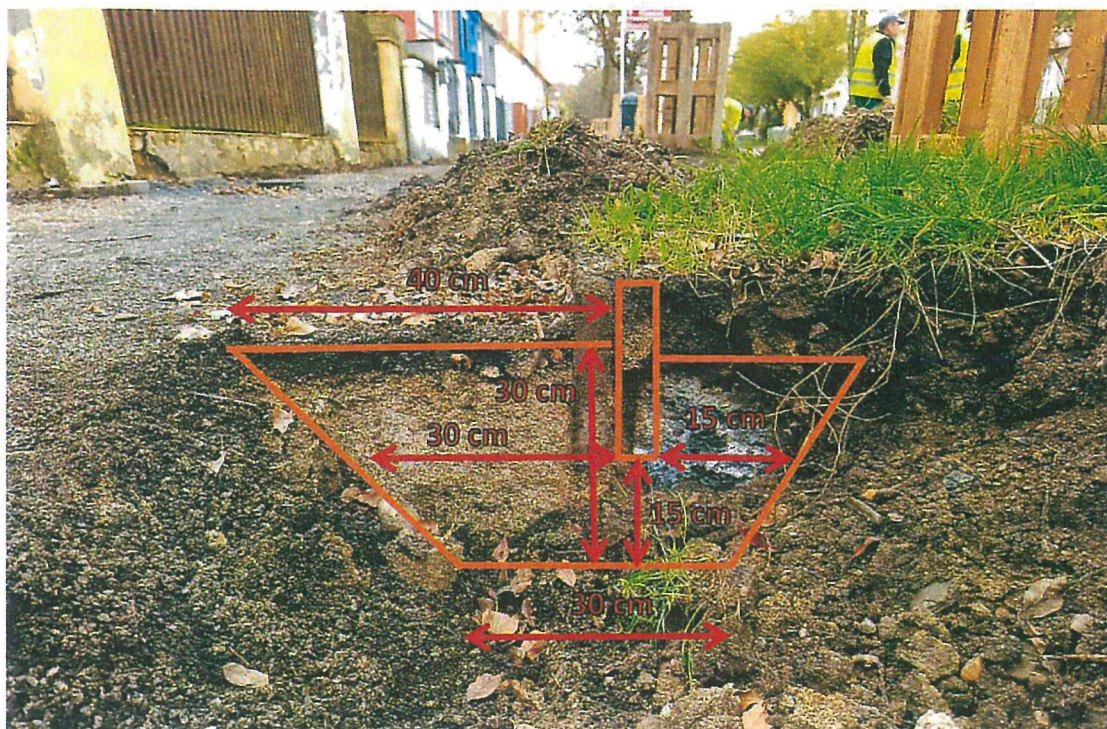

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací. Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín díla v rozsahu 3 dnů.

Vypracoval :

Odsouhlasil :

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00
18 172 31 099
1)

Zakázka: **Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa**

ZBV č.: **5**

Název ZBV: **Doplnění vrstvy ŠD u chodníkových obrubníků**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
39.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	248,85	280,00	69 678,00
57.	SP	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	213,30	380,00	81 054,00

150 732,00

MI Roads a.s
Koželužská 2450/4, 180 C
IČ 173 31 099
061)

Vyjádření - projektanta ZDS

Předmět: ZBV 4 - Svoz nádob na odpad mimo staveniště
ZBV 5 - Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků
ZBV 6 - Výměna chodníkových obrubníků
ZBV 7 - Změna pozic reliéfní dlažby

Změna č. 05-08

ZBV 4 - Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

ZBV 5 - Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

ZBV 6 - Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

ZBV 7 - Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předlážit dle nově poskytnuté situace

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:

Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 4 - Svoz nádob na odpad mimo staveniště

ZBV 5 - Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků

Předmět: ZBV 6 Výměna chodníkových obrubníků

ZBV 7 - Změna pozic reliéfní dlažby

Změna č. 05-08

ZBV 4 - Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

ZBV 5 - Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

ZBV 6 - Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

ZBV 7 - Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předláždít dle nově poskytnuté situace

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby

Pavepro s.r.o.

V lukách 2887/18 Horní Počernice

193 00, Praha 9

Podpis:

430 4-7









Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)		5

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
3 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	150 732,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
150 732,00 Kč

Zhotovitel:

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
IČ 173 31 099
(061)

Datum a podpis: 21.10.2024

Objednatel:

Datum a podpis:

21.10.2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)		5

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodnikových obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
3 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Stávající chodnikové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	150 732,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
150 732,00 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Radek Wurdak

Datum a podpis: 13. 11. 2024

Datum a podpis: 13. 11. 2024

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací
